


モニタリング調査位置

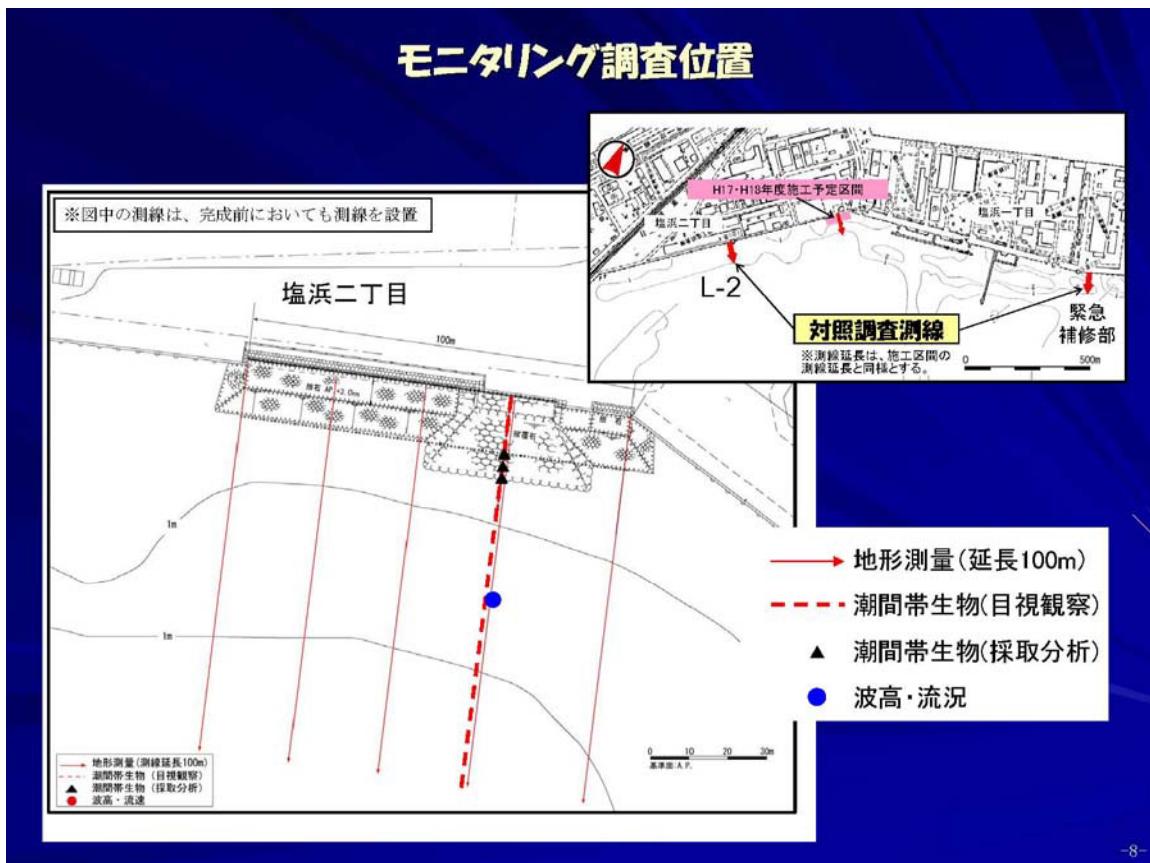

実施工工程表

| 項目 | 年度 月 | H17 | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-----------------------------------|---------|-------|----|------------------|----|-----------------|----|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|
| | | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 護岸工事 | 準備工 | 手続きなど | | | | | | | | | | | | | |
| | 捨石工 | | | 基本断面部、捨石部 L=100m | | 基本断面部 追加分 L=20m | | | | | | | | | |
| | 鋼矢板工 | | | | | 海側・陸側 L=100m | | | | | | | | | |
| | 鋼杭工 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 被覆工 | | | | | A.P.+3.0m以下 | | A.P.+3.0m以上 | | | | | | | 基本断面部 完成 L=20m |
| モニタリング調査 | 陸上工事 | | | 既設上部工撤去 | | 上部工新設 | | | | | | | | | |
| | 波浪・流況 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地形 | | | | | | | | | | | | | | 19年度は4月上旬に計画 |
| | 底質 | | | | | | | | | | | | | | 19年度は4月上旬に計画 |
| | 生物 | | | | | | | | | | | | | | 19年度は4月、9月上旬に計画 |
| | 景観 | | | | | | | | | | | | | | 19年度も計画 |
| 今回の実施した調査 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海域施工期間 (4月～8月) ← → のり養殖期間 (9月～3月) | | | | | | | | | | | | | | | |

-9-
