

# 東京外かく環状道路連絡協議会

## 第26回 環境保全専門部会

### 工事に伴う環境保全対策

#### 【説明資料】

平成24年3月23日  
国土交通省首都国道事務所  
東日本高速道路(株)千葉工事事務所

### ■工事概要①

	工事名	工期	内容	説明会
矢切地区	新葛飾橋 (下部工) 工事	東日本高速道路(株)さいたま工事事務所にて施工中		
	小山高架橋北 (下部工) 工事	平成23年02年08日 ～平成25年05年27日	掘削工 1式 仮設工 1式 下部工 15基	お知らせ文(チラシ) を地元配布
	小山高架橋南 (下部工) 工事	平成22年03年12日 ～平成25年04年24日	掘削工 1式 仮設工 1式 下部工 16基	

#### ■現在の状況

- 新葛飾橋(下部工) 工事 : 橋梁下部工
- 小山高架橋北(下部工) 工事 : 準備工、橋梁基礎工
- 小山高架橋南(下部工) 工事 : 準備工、仮架橋工、作業構台工

## ■工事概要②

	工事名	工期	内容	説明会
矢切地区	矢切函渠その5工事	平成21年02月20日 ～平成24年03月31日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 75m	平成21年07月30日
	矢切函渠その7工事	平成21年02月24日 ～平成24年03月31日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 80m	
	矢切函渠その8工事	平成23年02月11日 ～平成25年05月30日	函渠工 90m	自治会長へ説明
	矢切函渠その9工事	平成23年12月28日 ～平成26年10月31日	函渠工 240m 仮設工 1式	準備中

### ■現在の状況

- 矢切函渠その5工事 : 函渠築造工
- 矢切函渠その7工事 : 函渠築造工
- 矢切函渠その8工事 : 函渠築造工
- 矢切函渠その9工事 : 準備工

## ■工事概要③

	工事名	工期	内容	説明会
堀之内地区	堀之内地区函渠その3工事	平成22年11月02日 ～平成26年03月25日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 190m	お知らせ文(チラシ)を地元配布
	堀之内地区函渠その4工事	平成24年01月18日 ～平成26年03月25日	仮設工 1式 函渠工 65m	準備中

### ■現在の状況

- 堀之内地区函渠その3工事 : 掘削工、仮設工
- 堀之内地区函渠その4工事 : 準備工

## ■工事概要④

	工事名	工期	内容	説明会
国分地区	国分工事	平成22年01月28日 ～平成27年03月02日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 1,680m	平成22年03月25日
菅野・平田地区	市川中工事	平成22年11月30日 ～平成27年11月03日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 1,420m	平成23年05月29日
大和田地区	大和田工事	平成23年06月01日 ～平成28年01月05日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 3,316m	平成23年09月25日 平成23年10月16日 平成23年10月23日 平成23年10月30日

### ■現在の状況

- 国分工事 : 準備工、連壁工、中間杭工、通水対策工、掘削、仮設工
- 市川中工事 : 準備工、工事用仮橋杭工、工事用道路（仮橋）工、連壁工
- 大和田工事 : 準備工、連壁工

4

## ■工事概要⑤

	工事名	工期	内容	説明会
稲荷木地区	京葉工事	平成19年05月31日 ～平成24年09月30日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 80m	平成19年11月20日
田尻・高谷地区	田尻工事	平成22年09月10日 ～平成27年11月12日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 3,393m	平成23年02月22日
	田尻地区函渠工事	平成22年02月27日 ～平成24年3月23日	掘削工 1式 仮設工 1式 函渠工 100m	平成22年06月03日

### ■現在の状況

- 京葉工事 : 本線部躯体構築、埋戻し工
- 田尻工事 : ランプ部躯体構築、埋戻し工、準備工、連壁工、C-BOX（現況構造物取り壊し、新設構造物構築）
- 田尻地区函渠工事 : 躯体構築（防水工、型枠工、鉄筋工）、仮設工

5

## ■工事概要⑥

	工事名	工期	内容	説明会
田尻・高谷地区	田尻地区 函渠その2工事	平成23年03月04日 ～平成26年03月25日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約154m	お知らせ文(ﾌﾗｲ) を地元配布
	田尻地区 函渠その3工事	平成23年02月09日 ～平成26年03月25日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約111m	
	田尻地区 函渠その4工事	平成23年12月21日 ～平成27年03月25日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約175m	
	田尻地区 函渠その5工事	平成23年12月22日 ～平成27年03月25日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約190m	

### ■現在の状況

- 田尻地区函渠その2工事 : 中間杭打設・仮設工
- 田尻地区函渠その3工事 : 中間杭打設・仮設工・地盤改良
- 田尻地区函渠その4工事 : 準備工
- 田尻地区函渠その5工事 : 準備工

6

## ■工事概要⑦

	工事名	工期	内容	説明会
田尻・高谷地区	高谷I C ランプ改良その3工事	平成23年04月29日 ～平成24年03月30日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約30m	お知らせ文(ﾌﾗｲ) を地元配布
	高谷I C ランプ改良その4工事	平成23年04月29日 ～平成24年10月31日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約30m	
	高谷I C ランプ改良その5工事	平成23年04月29日 ～平成24年03月30日	掘削・仮設工 1式 函渠工 約30m	

### ■現在の状況

- 高谷I Cランプ改良その3工事 : 掘削工・仮設工
- 高谷I Cランプ改良その4工事 : 準備工
- 高谷I Cランプ改良その5工事 : 連壁工、地盤改良

7

## ■工事概要⑧

	工事名	工期	内容	説明会
田尻・高谷地区	高谷ジャンクション 橋東工事	平成21年11月17日 ～平成25年01月29日	下部工 32基 上部工 4,977㎡	—
	田尻高谷地区 改良その5工事	平成24年02月18日 ～平成24年10月31日	掘削・仮設工 1式	—
	田尻高谷 改良その6工事	平成24年02月21日 ～平成24年10月31日	掘削・仮設工 1式	—
	田尻高谷 改良その7工事	平成24年02月16日 ～平成24年10月31日	掘削・仮設工 1式	—
	田尻高谷 改良その8工事	平成24年02月21日 ～平成24年10月31日	掘削・仮設工 1式	—

### ■現在の状況

- 高谷ジャンクション橋東工事 : 橋梁上部工、橋梁下部工
- 田尻高谷地区改良その5工事 : 準備工
- 田尻高谷改良その6工事 : 準備工
- 田尻高谷改良その7工事 : 準備工
- 田尻高谷改良その8工事 : 準備工

8

## ■工事概要⑨


	工事名	工期	内容	説明会
田尻・高谷地区	高谷高架橋 (下部工) 工事	平成22年04月16日 ～平成24年05月04日	掘削工 1式 仮設工 1式 下部工 18基	—
	高谷高架橋 (鋼上部工) 工事	平成22年11月30日 ～平成25年09月14日	仮設工 1式 上部工 8,206㎡	—
	高谷ジャンクション 橋北 (下部工) 工事	平成23年04月26日 ～平成25年07月13日	掘削工 1式 仮設工 1式 下部工 20基	—
	高谷ジャンクション 橋南 (下部工) 工事	平成23年10月12日 ～平成25年10月30日	掘削工 1式 仮設工 1式 下部工 20基	—
	高谷ジャンクション 橋北 (鋼上部工) 工事	平成24年02月10日 ～平成26年08月22日	仮設工 1式 上部工 13,824㎡	—

### ■現在の状況


- 高谷高架橋 (下部工) 工事 : 橋梁下部工
- 高谷高架橋 (鋼上部工) 工事 : 準備工、橋梁上部工
- 高谷ジャンクション橋北 (下部工) 工事 : 準備工
- 高谷ジャンクション橋南 (下部工) 工事 : 準備工
- 高谷ジャンクション橋北 (鋼上部工) 工事 : 準備工

9


# ■工事位置図・断面図（矢切地区）





小山高架橋南（下部工）工事の工事範囲  
小山高架橋北（下部工）工事の工事範囲




矢切函渠その5工事の工事範囲



矢切函渠その9工事の工事範囲

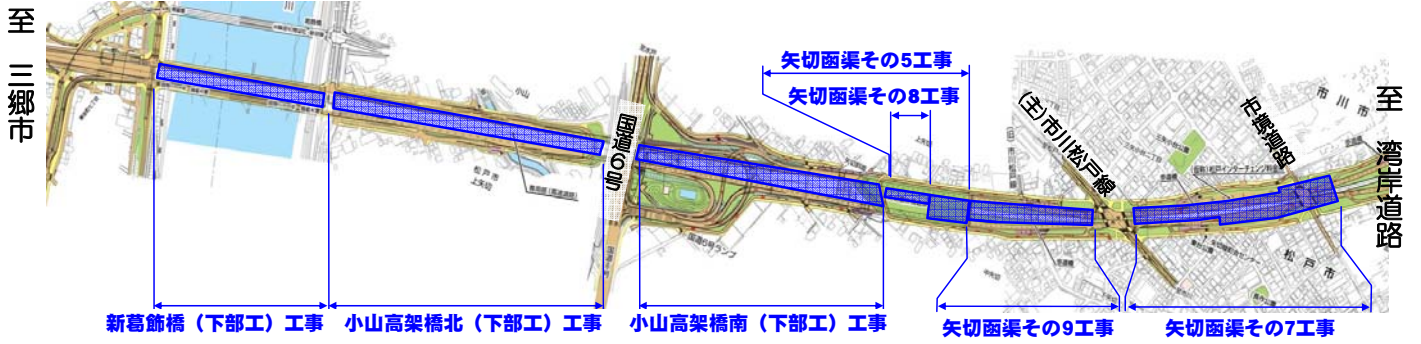



矢切函渠その8工事の工事範囲




矢切函渠その7工事の工事範囲

10

# ■工事位置図・断面図（堀之内地区）

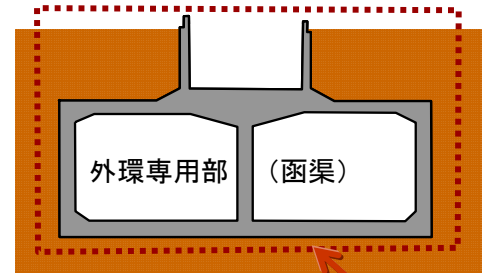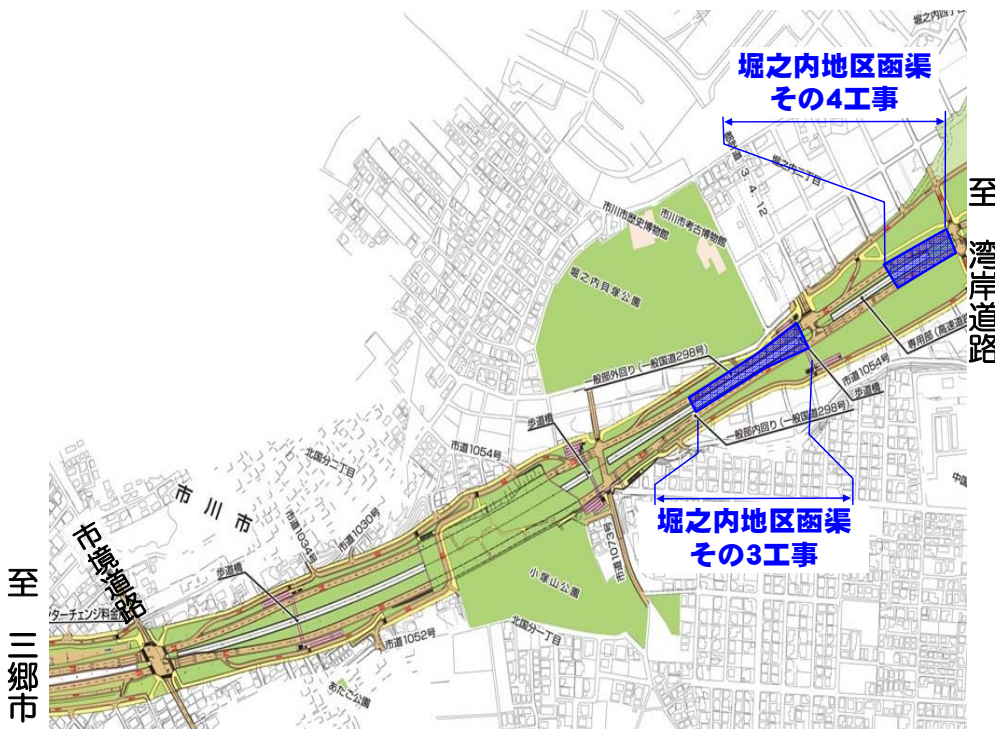


堀之内地区函渠その3工事の工事範囲

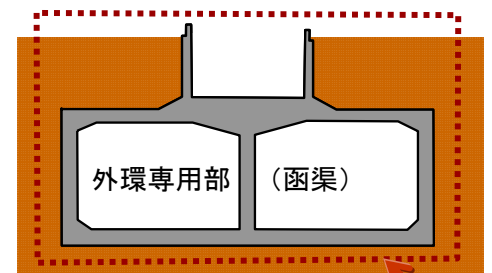

堀之内地区函渠その4工事の工事範囲

11

# ■工事位置図・断面図（国分地区）

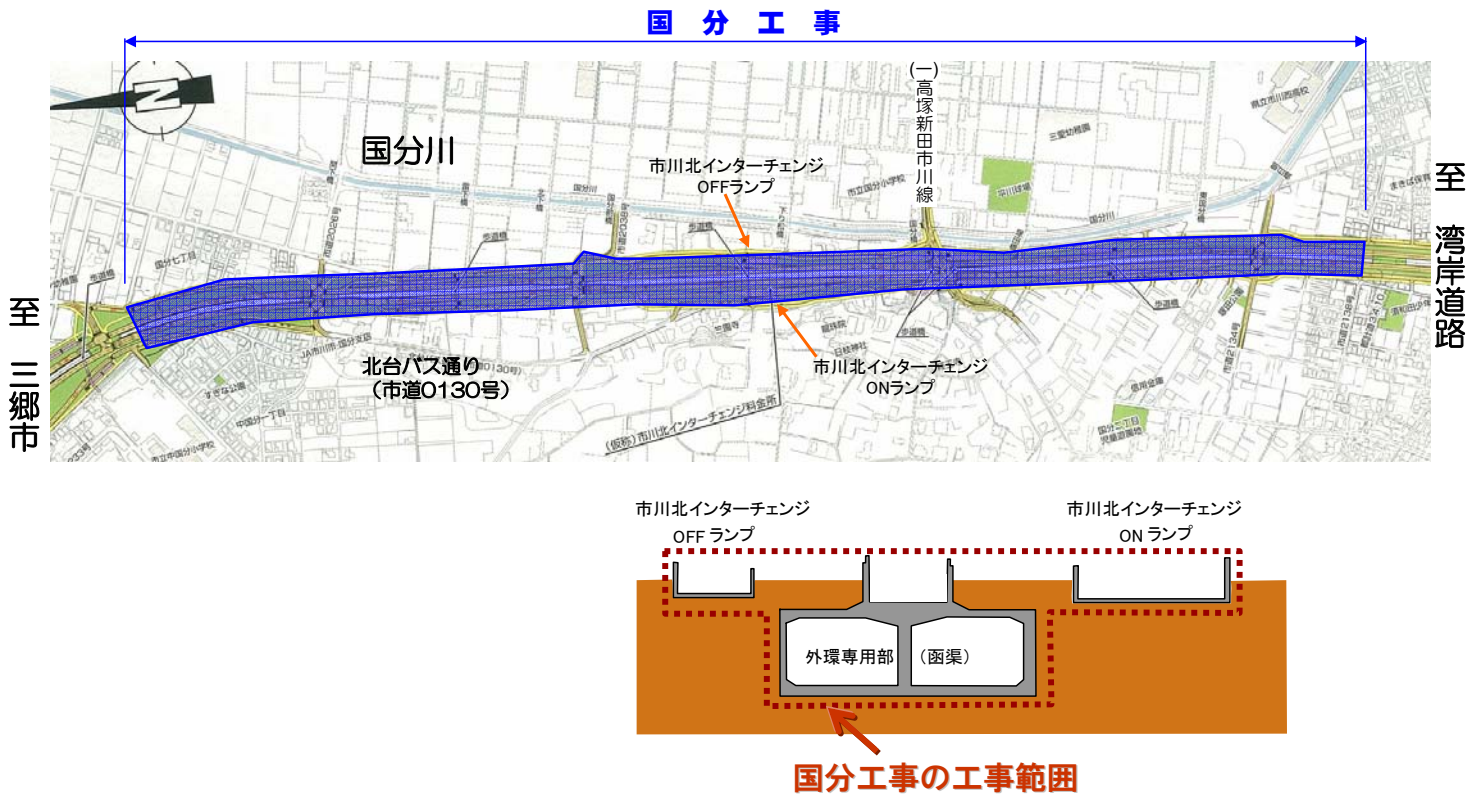

# ■工事位置図・断面図（菅野地区）

