


1丁目護岸 完成後の検証・評価


< 防護 >

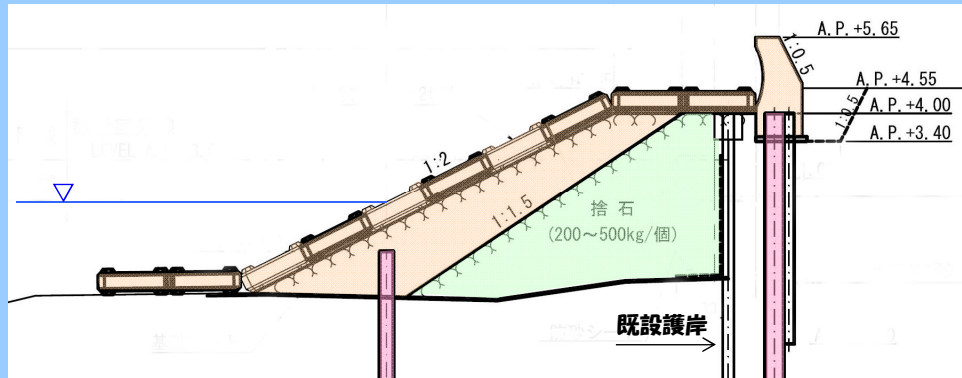


平成27年 1月

1. “防護” に対する3つの指標


- ① “緊急対応” への指標 : 既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。

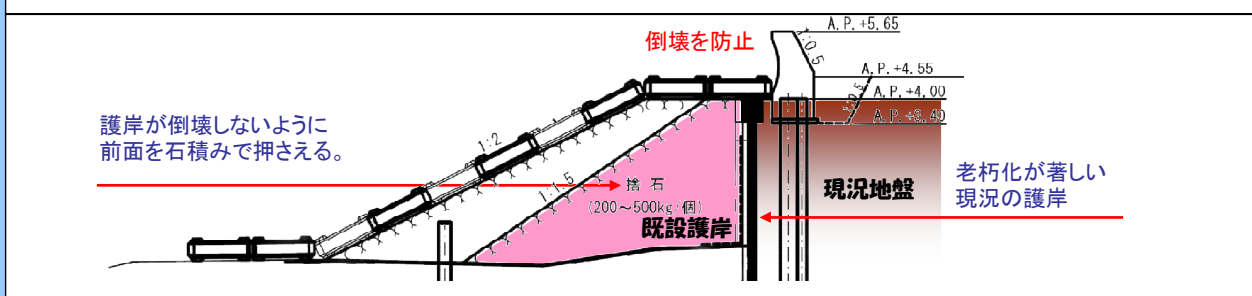

- ② “耐震” への指標 : H鋼杭(海側、陸側)が打設されたか。

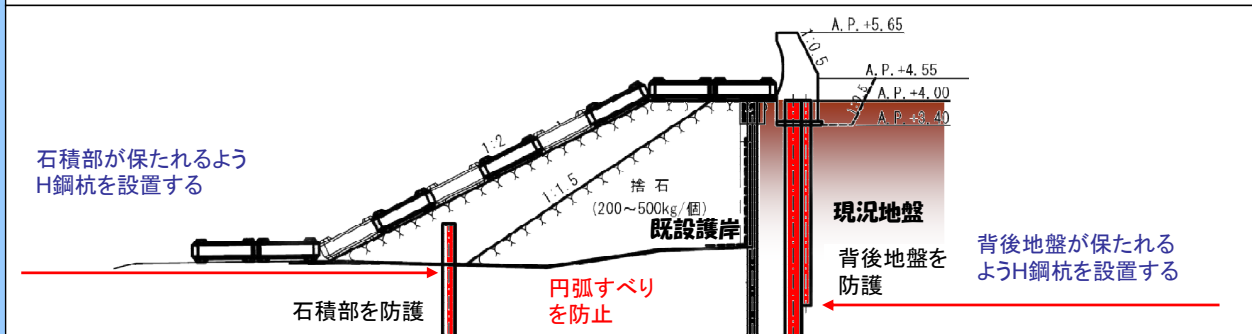

③ ”越波低減”への指標 : 傾斜堤の高さがA.P.+5.65mに達しているか。

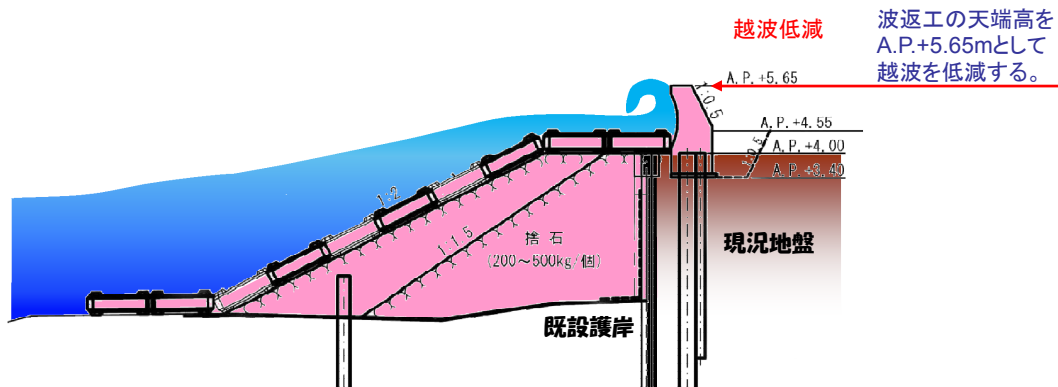

2. 検証基準

目標達成基準

早急な安全性の確保

検証項目	目標達成時期	検証場所	基準とする値
防護の確保状況	平成25年度頃	塩浜1丁目	地域の防護に対する3つ指標がそれぞれ施工延長600mにわたって、 ①緊急対応への指標 100% ②耐震の指標 100% ③越波低減への指標 100% を確保すること。


3. 検証結果(指標ごと)

① "緊急対応"への指標 : 既設護岸の補強に必要な石積が確保されたか。
⇒ 100 / 100

② "耐震"への指標 : H鋼杭(海側、陸側)が打設されたか。
⇒ 100 / 100

③ "越波低減"への指標 : 傾斜堤の高さがA.P.+5.65mに達しているか。
⇒ 100 / 100

施工年次毎の
達成状況

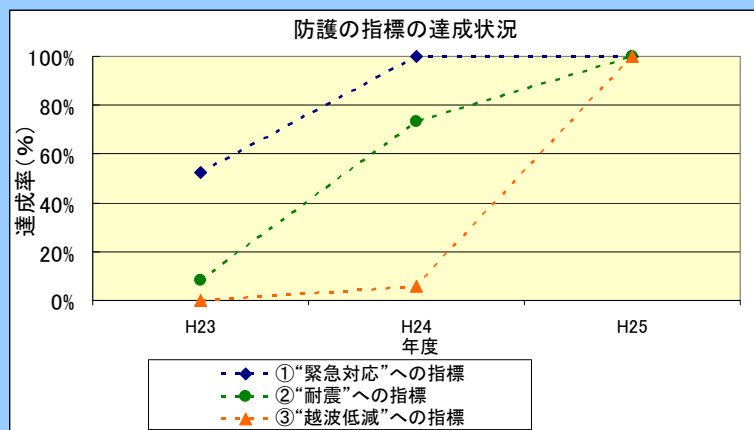

4

完成後の護岸



5

4. 完成後の評価

目標達成 基準	早急な安全性の確保
------------	-----------



検証結果	① ” 緊急対応 ” への指標 ⇒ 100 / 100 ② ” 耐 震 ” への指標 ⇒ 100 / 100 ③ ” 越波低減 ” への指標 ⇒ 100 / 100
------	--



防護の 評価	”緊急対応”、”耐震”、”越流低減”ともに、100%達成し、検証基準を満たした。 防護に関する目標「早急な安全性の確保」は達成されたものと評価する。
-----------	---
