


## 習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線 工事進捗についてお知らせ

藤崎茜浜線では、令和7年度内の開通を目標に跨線橋の架設や取付道路の整備を進めてきましたが、追加の地盤改良工事や工事の発注手続きを行ったところ契約に至らない状況（入札不調）が生じたことにより、事業期間につきまして、令和10年度末まで3年間の延伸を行うこととなりました。

今後も一日でも早い開通を目指し、跨線橋前後の取付道路工事、側道工事、鷺沼台側の市道工事等の工事を引き続き進めてまいります。

近隣の皆様方におかれましては、引き続き、騒音・振動・通行規制等で大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。

開通見込時期については、皆様にお示しできる段階になり次第、改めてお知らせさせていただきます。

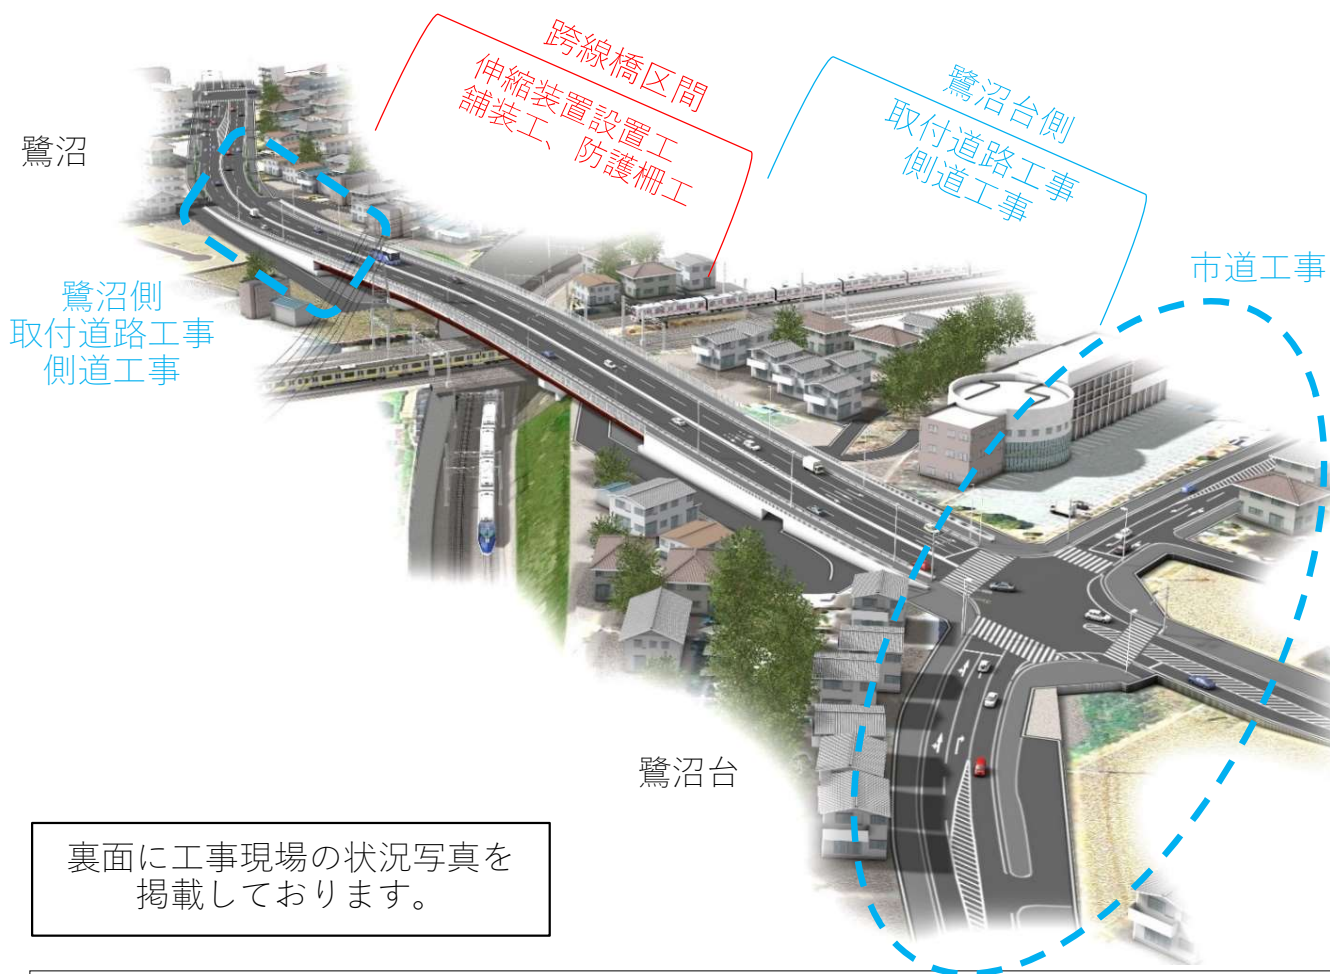

裏面に工事現場の状況写真を  
掲載しております。

お問い合わせ先


千葉県 千葉土木事務所 公園街路課

電話 043-242-6104


メール chisei1@mz.pref.chiba.lg.jp



# 習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線 工事進捗状況写真

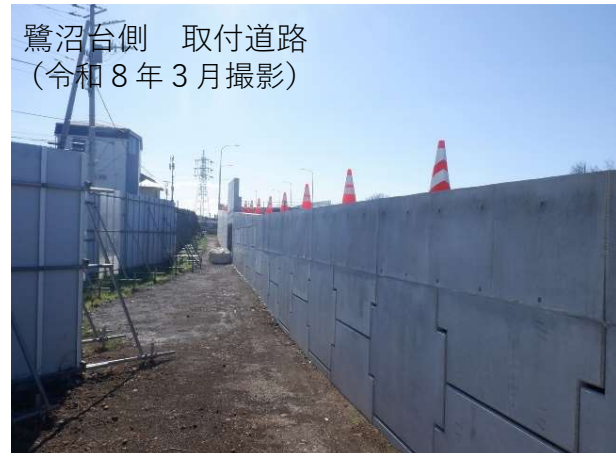


跨線橋部



跨線橋は排水施設を施工。今後、防護柵・舗装・伸縮装置工事等（赤着色部）を行います。

取付道路部



取付道路は擁壁工事が完了。今後、防護柵・舗装・側道工事等（赤着色部）を行います。
