


習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線 工事の進捗状況についてお知らせ

地元の皆さまにご協力いただき整備を進めています藤崎茜浜線は、今年度工事を実施していましたが鷺沼側で橋を架けるための作業台構築工及び鷺沼台側の橋台築造工が完成しました。

引き続き、鷺沼側で橋桁の組立及び架設準備、鷺沼台側で地盤改良工を進めております。

近隣の皆様方におかれましては、引き続き、騒音・振動・通行規制等で大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。

裏面に工事現場の状況写真を掲載しております。

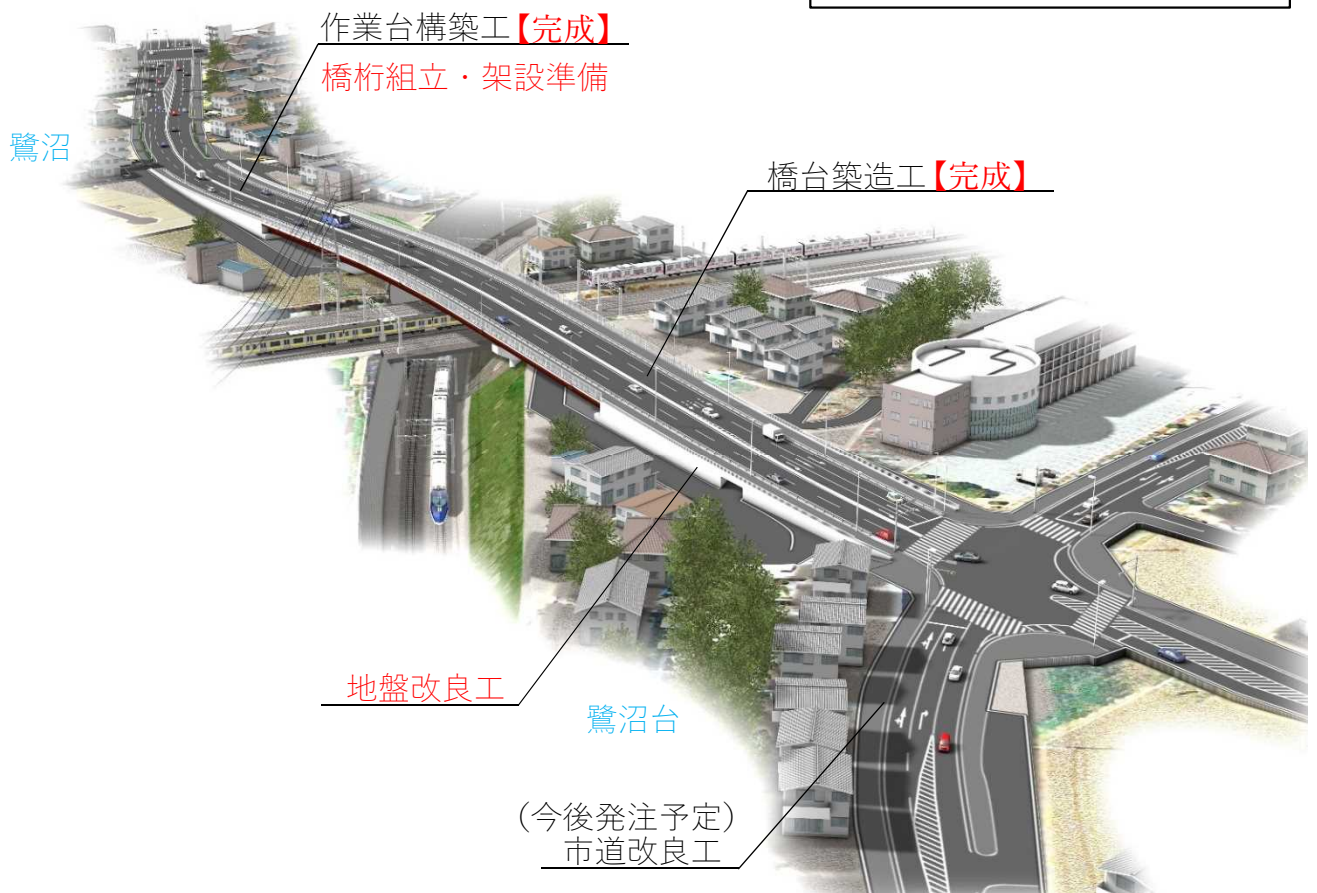

お問い合わせ先

千葉県 千葉土木事務所 公園街路課
電話 043-242-6104
メール chisei1@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉土木 公園街路課メール



習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線 工事現場の状況



(鷺沼台側) 橋台築造工 完成

この橋台では、約400トンの重量を受け止めます。



(鷺沼側)
作業台構築工 完成

この作業台で橋桁を組み立てます。
今年の夏頃に線路上に橋桁を架ける作業を実施する予定です。

橋桁 工場製作状況

総重量およそ1500トンの鋼橋です。
大阪府の工場で作っています。
運搬可能な大きさに分解して、
1月下旬頃から順次、トラックで
習志野市まで輸送してきます。

