

(主) 大多喜君津線 市原市 国本 概要



【時系列】

- 6月19日(水)
法面崩落① (6:00頃)
(全面通行止め 8:00~)
東電復旧作業
- 6月20日(木)
道路上の崩落土砂等撤去作業
- 6月21日(金)
法面崩落②
- 6月22日(土)
法面崩落③
- 6月26日(水)~27日(木)
法面崩落④
- 7月4日
地形UAV測量
- 7月10日
法面に伸縮計を設置
(クラック幅を計測)
- 7月24日~9月13日
樹木撤去
- 8月5日~9月13日
不安定土塊撤去(法面高所掘削機)
- 8月19日~9月20日
地質調査(ボリソグ、弾性波探査)
- 9月5日~7日
NTT光ケーブル切替
- 10月8日~11月中旬
地形測量
- 9月23日~11月上旬
ロックシェッド上吹付法枠、土砂撤去
- 10月17・18日
ロックシェッドの点検




【6月18日(火)の雨量】

雨量観測所	24時間雨量	時間最大雨量
上総出張所	133 mm	16 mm(15時)
高滝ダム	125 mm	15 mm(15時)



(主) 大多喜君津線 市原市国本 被災状況

R6.7.4

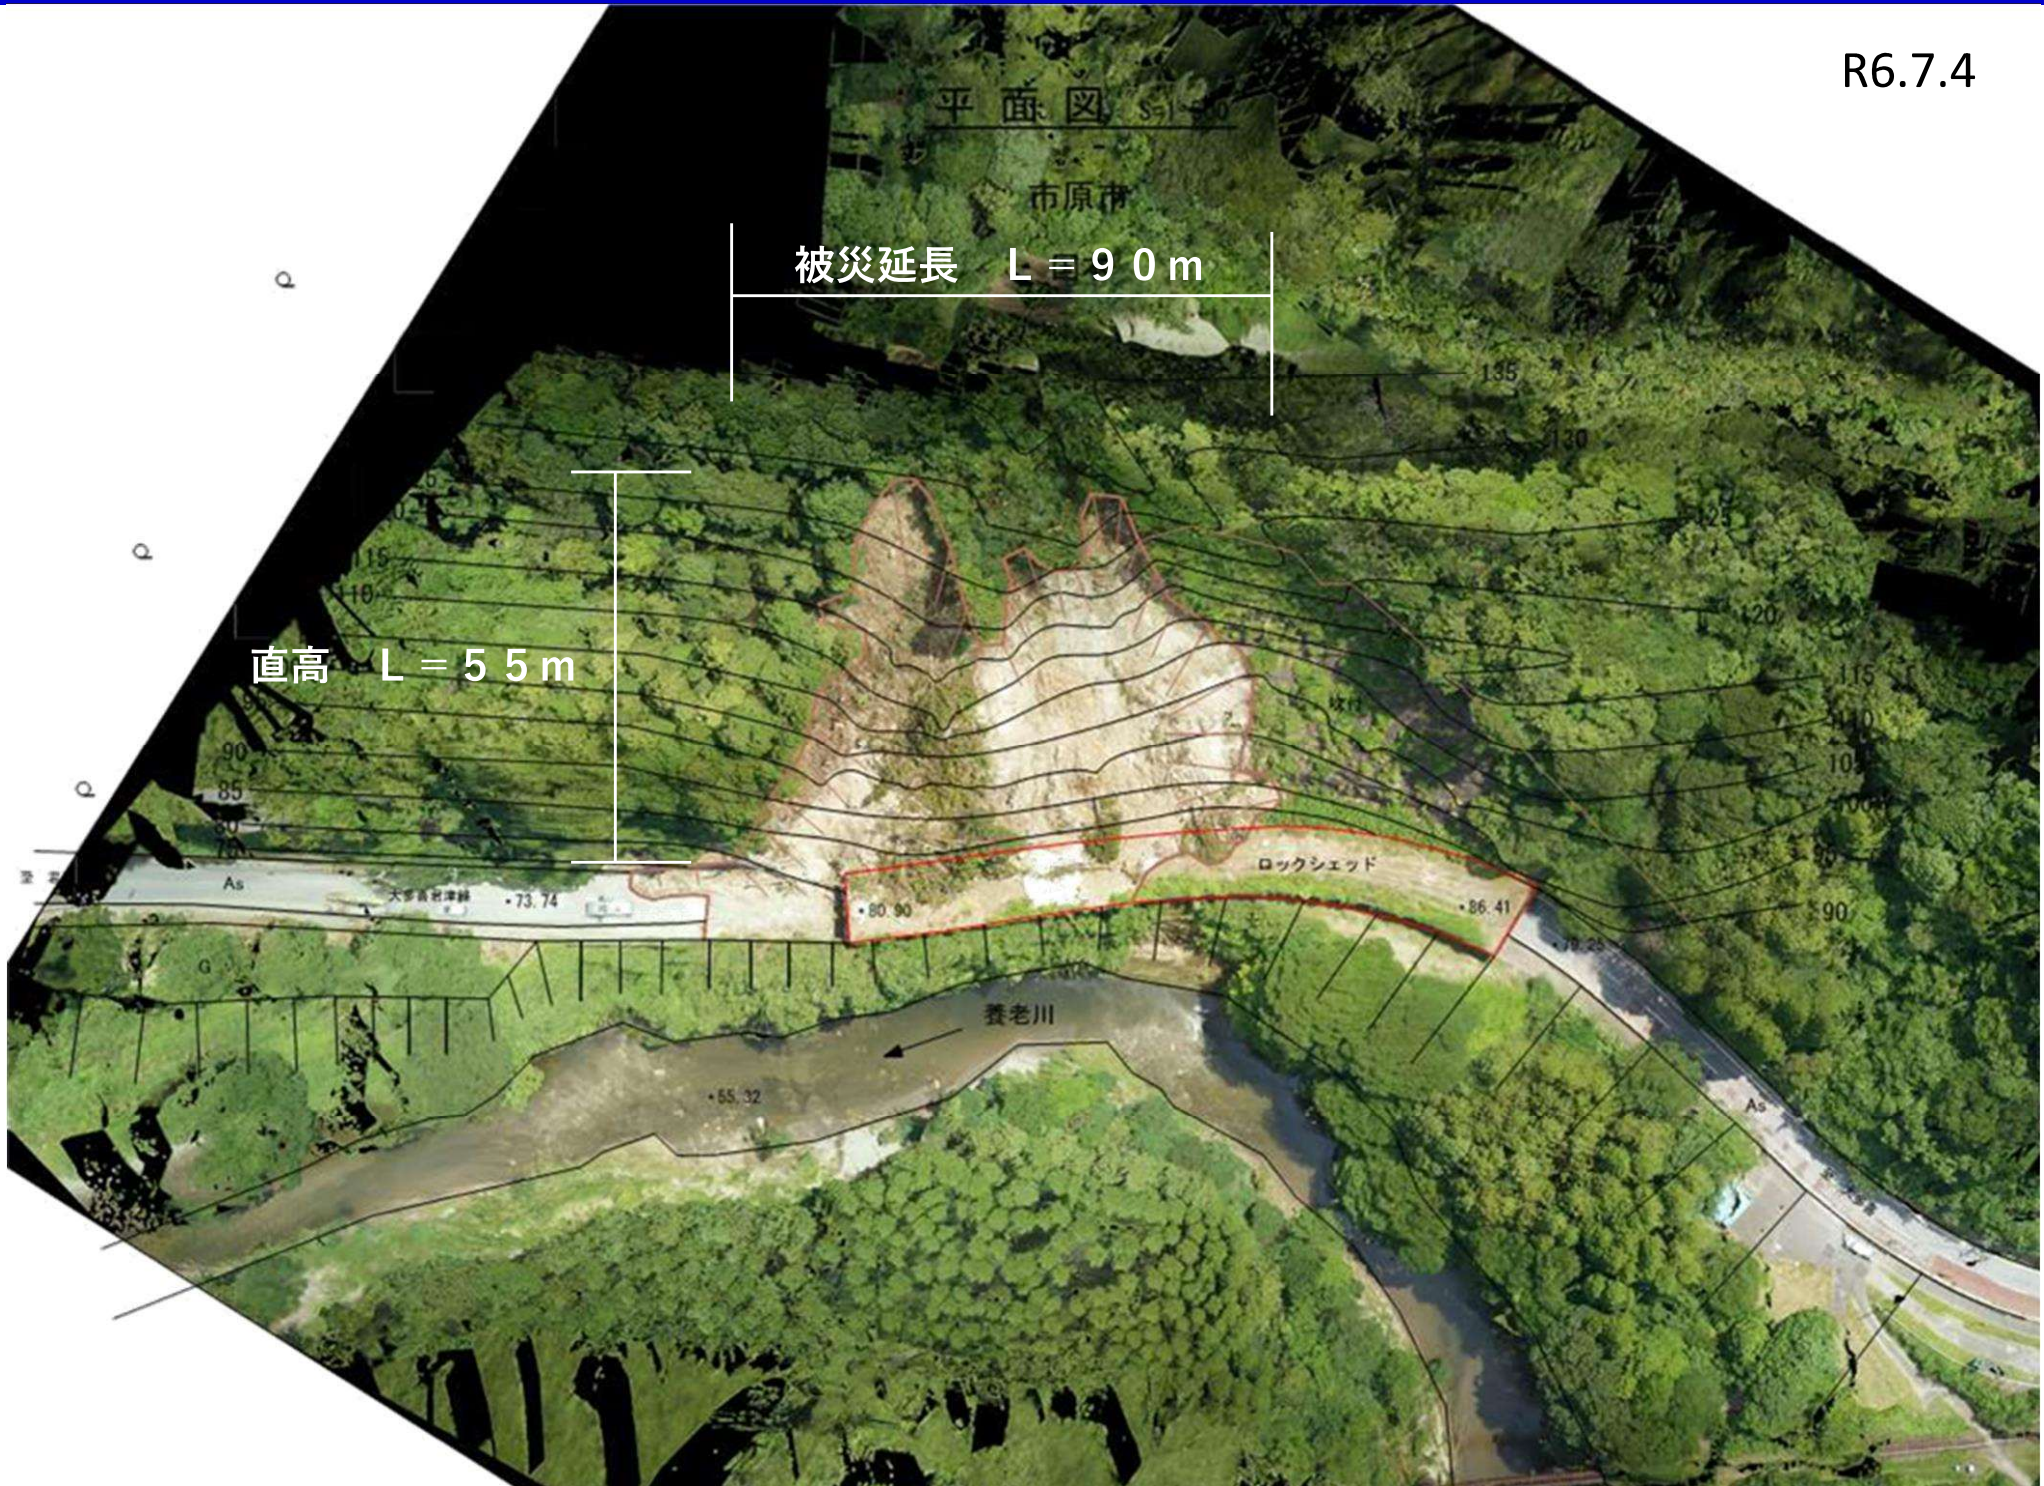

(主) 大多喜君津線 市原市国本 不安定土塊撤去状況

R6.9.17

