

事業名	総合治水対策特定河川事業
河川名	一級河川 利根川水系 国分川
工事箇所	松戸市大橋


(概要)

国分川は、江戸川と東京湾に流入する（一）真間川（水系総指定延長約27.2km、流域面積65.6km<sup>2</sup>）の支川（指定延長5,560m、流域面積30.8km<sup>2</sup>）である。

国分川は、国分川調節池の整備が平成25年度末に完了し、現在は真間川合流部から国分川橋上流までの約3.6km区間の河道改修が完了したところである。

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：10,000百万円 事業期間：昭和54年度～令和8年度 事業延長：4,380m 築堤工：5,200m 護岸工：3,540m 道路橋：18橋 用地買収：48,563m <sup>2</sup>	事業費：7,374百万円 （進捗率：74%） 築堤工：5,200m 護岸工：2,324m 道路橋：16橋 用地買収：27,545m <sup>2</sup>	事業費：5百万円 （進捗率：75%） 観測業務：1式 ほか

【位置図】

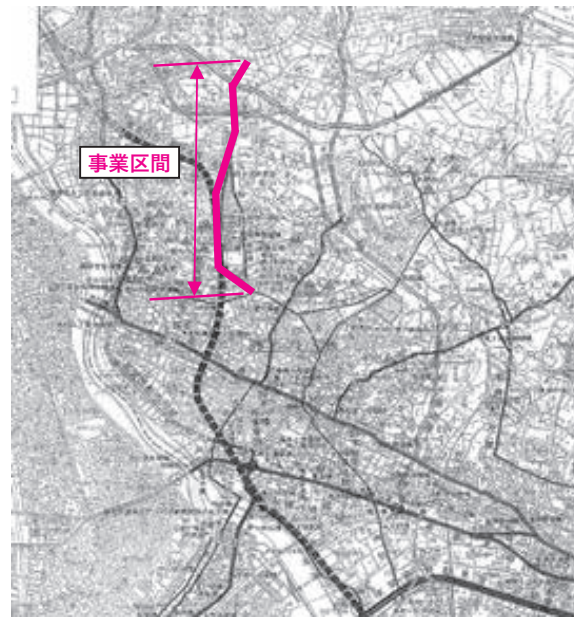

【代表断面】

松戸市 大橋 外

