

# 四街道市公共下水道事業 事業再々評価(汚水)

平成 20 年 11 月  
千葉県四街道市

# 四街道市の概要

本市は県の北部に位置し、千葉市、佐倉市に隣接している。東部には鹿島川、南西部は林野が多く、近年は、自然環境を生かした首都圏のベッドタウンとして発展してきた。




# 事業の必要性(汚水)

**【汚水】**

**生活環境の改善**

**公共用水域の水質保全**

# 下水道事業の概要(汚水)

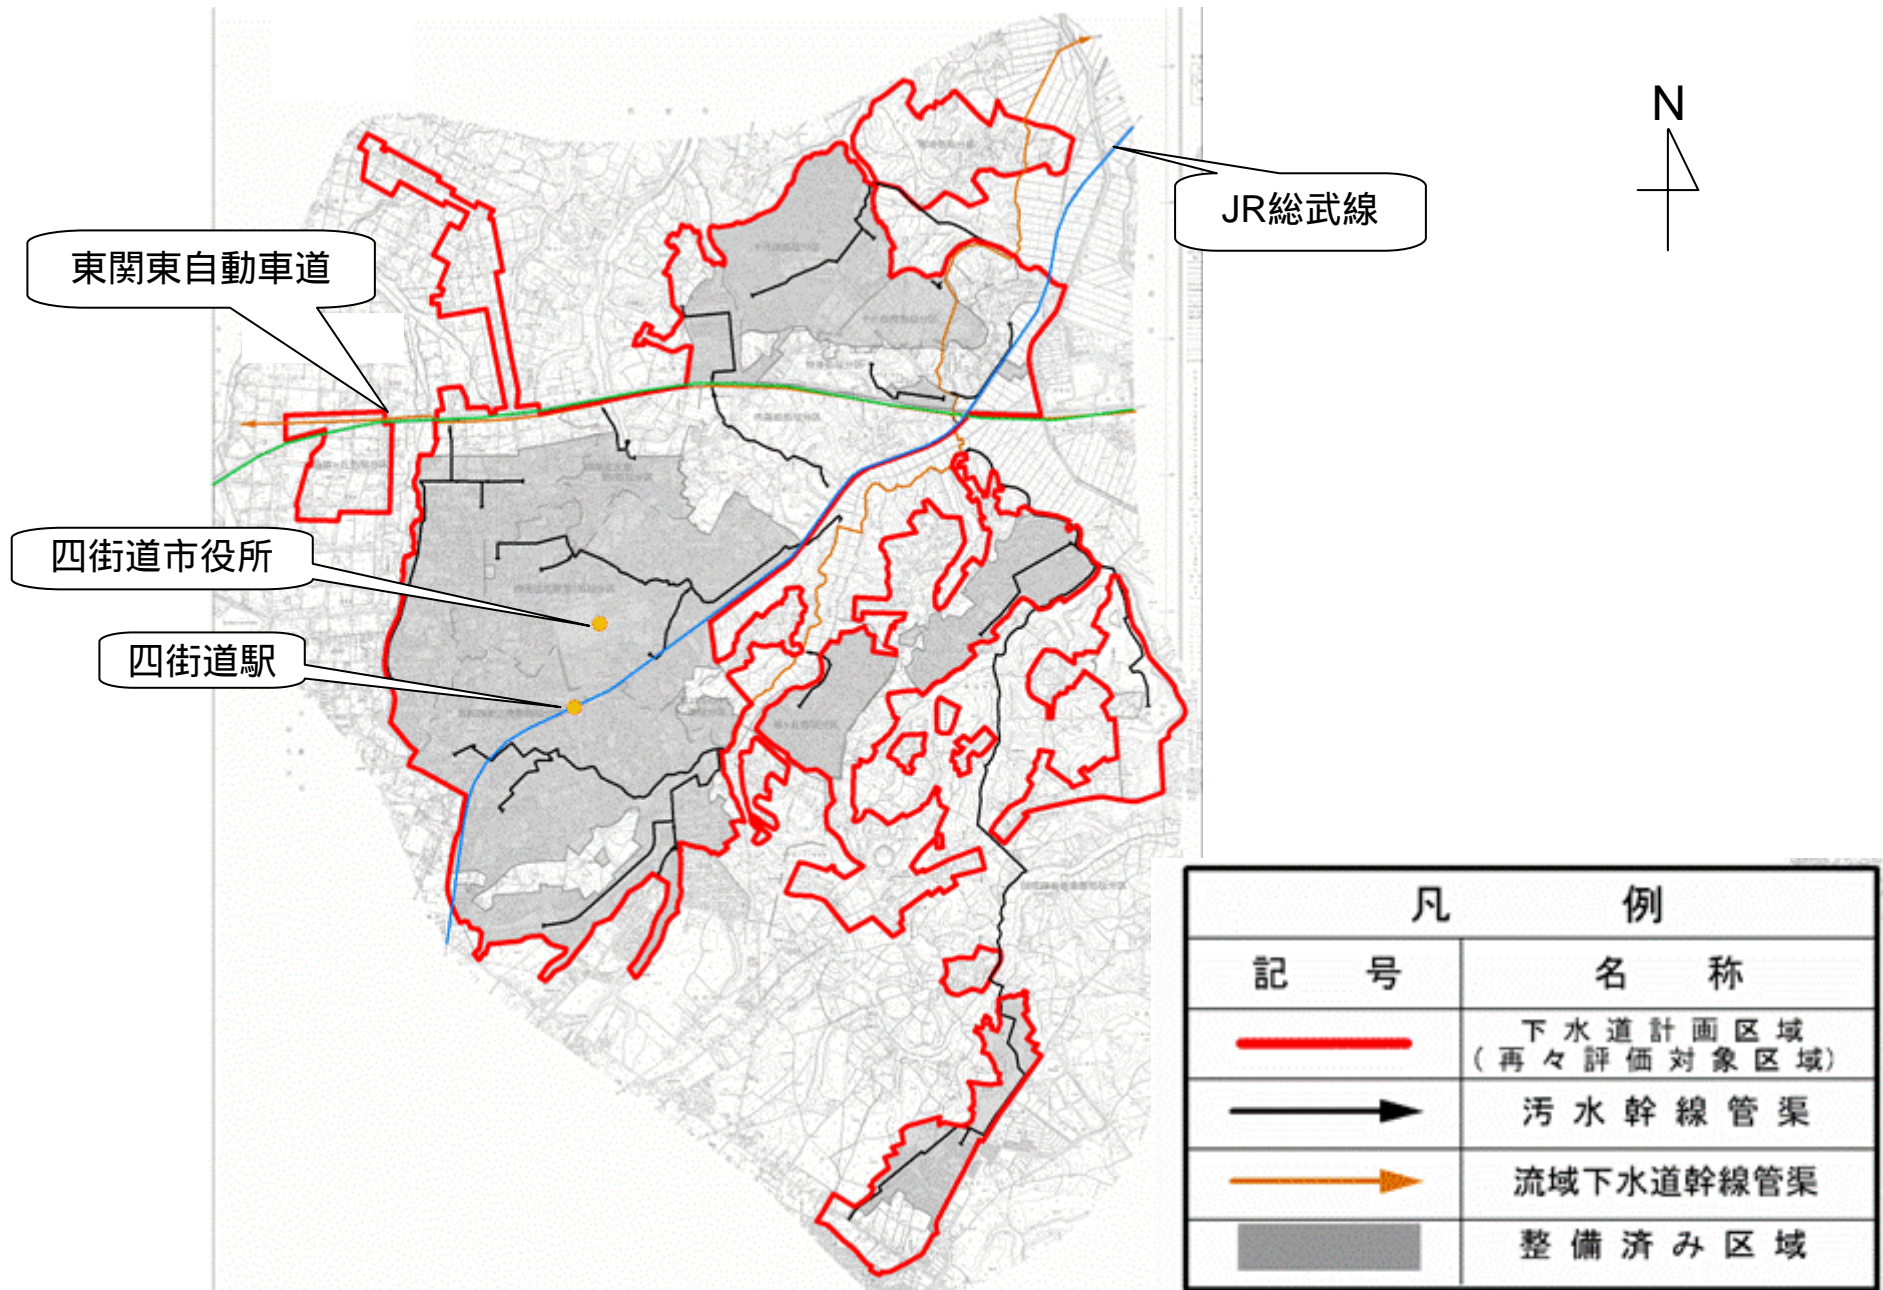

## 指標1 費用効果分析(汚水)


総便益 ( B )	2,118億円
総費用 ( C )	1,536億円
費用便益費 ( B / C )	1.4

## 指標2 事業の進捗状況(汚水)

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画1,309haに対して、1,088haを整備し、整備率は83%である。
供用開始区域の接続状況	接続率は94%である。
地元情勢等	四街道市議会の理解及び地元住民の協力は得られている。



## 指標2 事業の進捗状況(汚水)

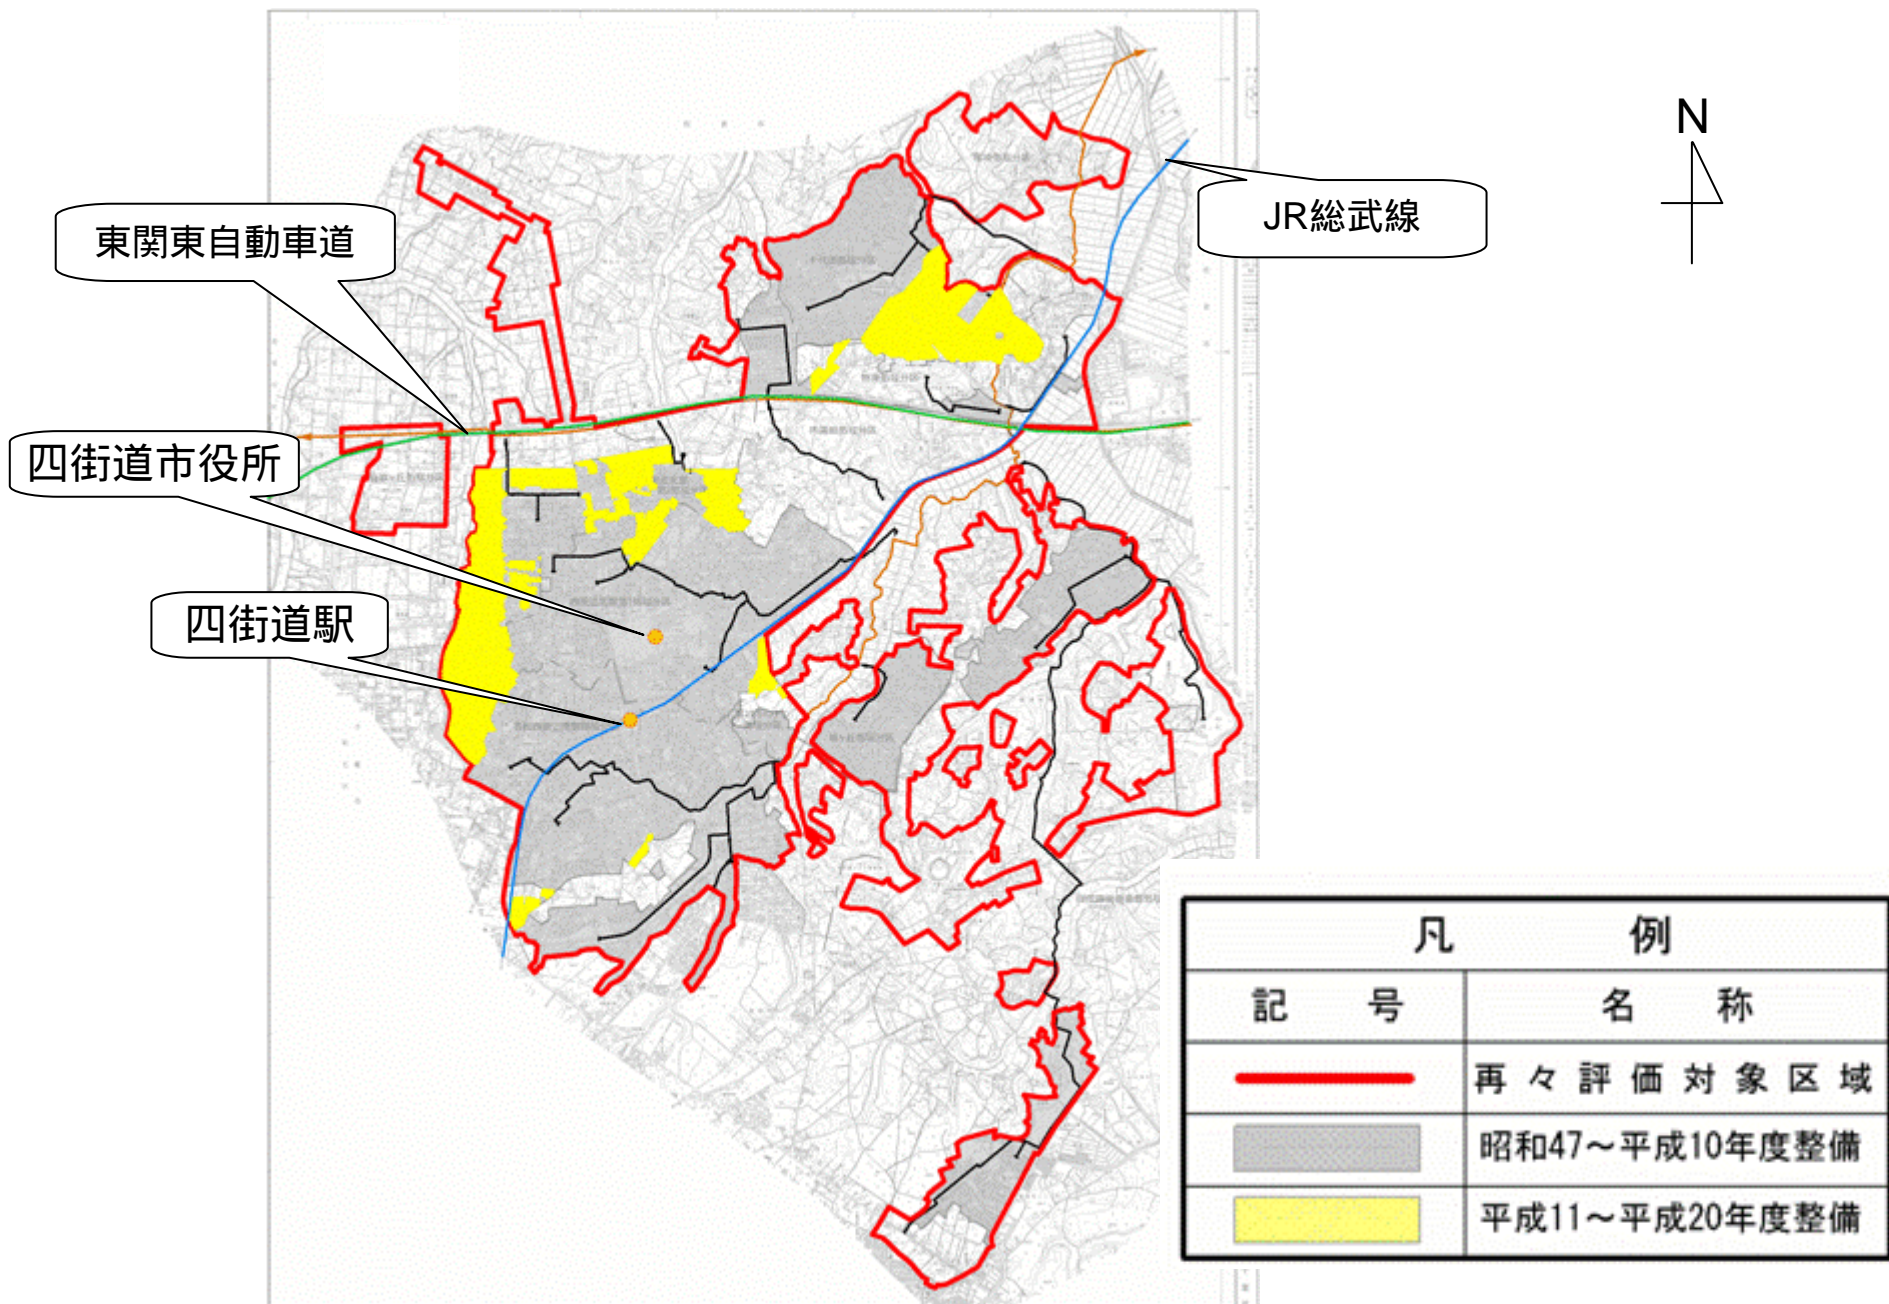

## 指標3 社会経済情勢等(汚水)

指標	状況
社会経済情勢	下水道事業に影響のある社会経済情勢の変化は特にない。
自然環境条件	東京湾の水質汚濁に係わる水質環境基準に変更はない。
計画変更の有無及びその程度	全体計画及び事業計画について、必要に応じ適切に見直している。



## 指標4 コスト縮減・代替案(汚水)

指 標	状 況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。
代替案	本市の市街化の状況から、代替としての浄化槽整備よりも、下水道整備が最適。

## 対応方針(汚水)案

四街道市公共下水道事業(汚水)は順調に進展しており、今後も順調な進展が見込まれることから、当該事業を継続していく方針です。

# 四街道市公共下水道事業 事業再々評価(雨水)

平成 20 年 11 月  
千葉県四街道市

# 四街道市の概要

本市は県の北部に位置し、千葉市、佐倉市に隣接している。東部には鹿島川、南西部は林野が多く、近年は、自然環境を生かした首都圏のベッドタウンとして発展してきた。



松並木通り



裸まつり




# 事業の必要性(雨水)




## 【雨水】

浸水による被害から住民の  
安全と財産を守る

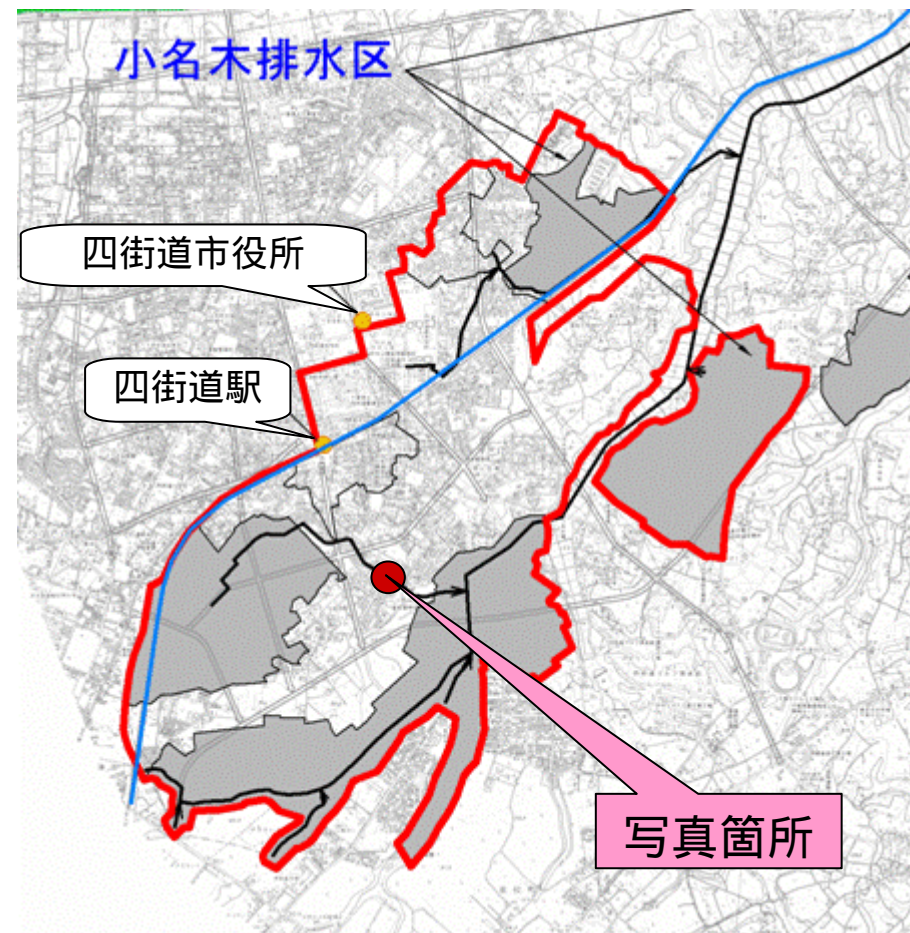



# 事業の概要(雨水)

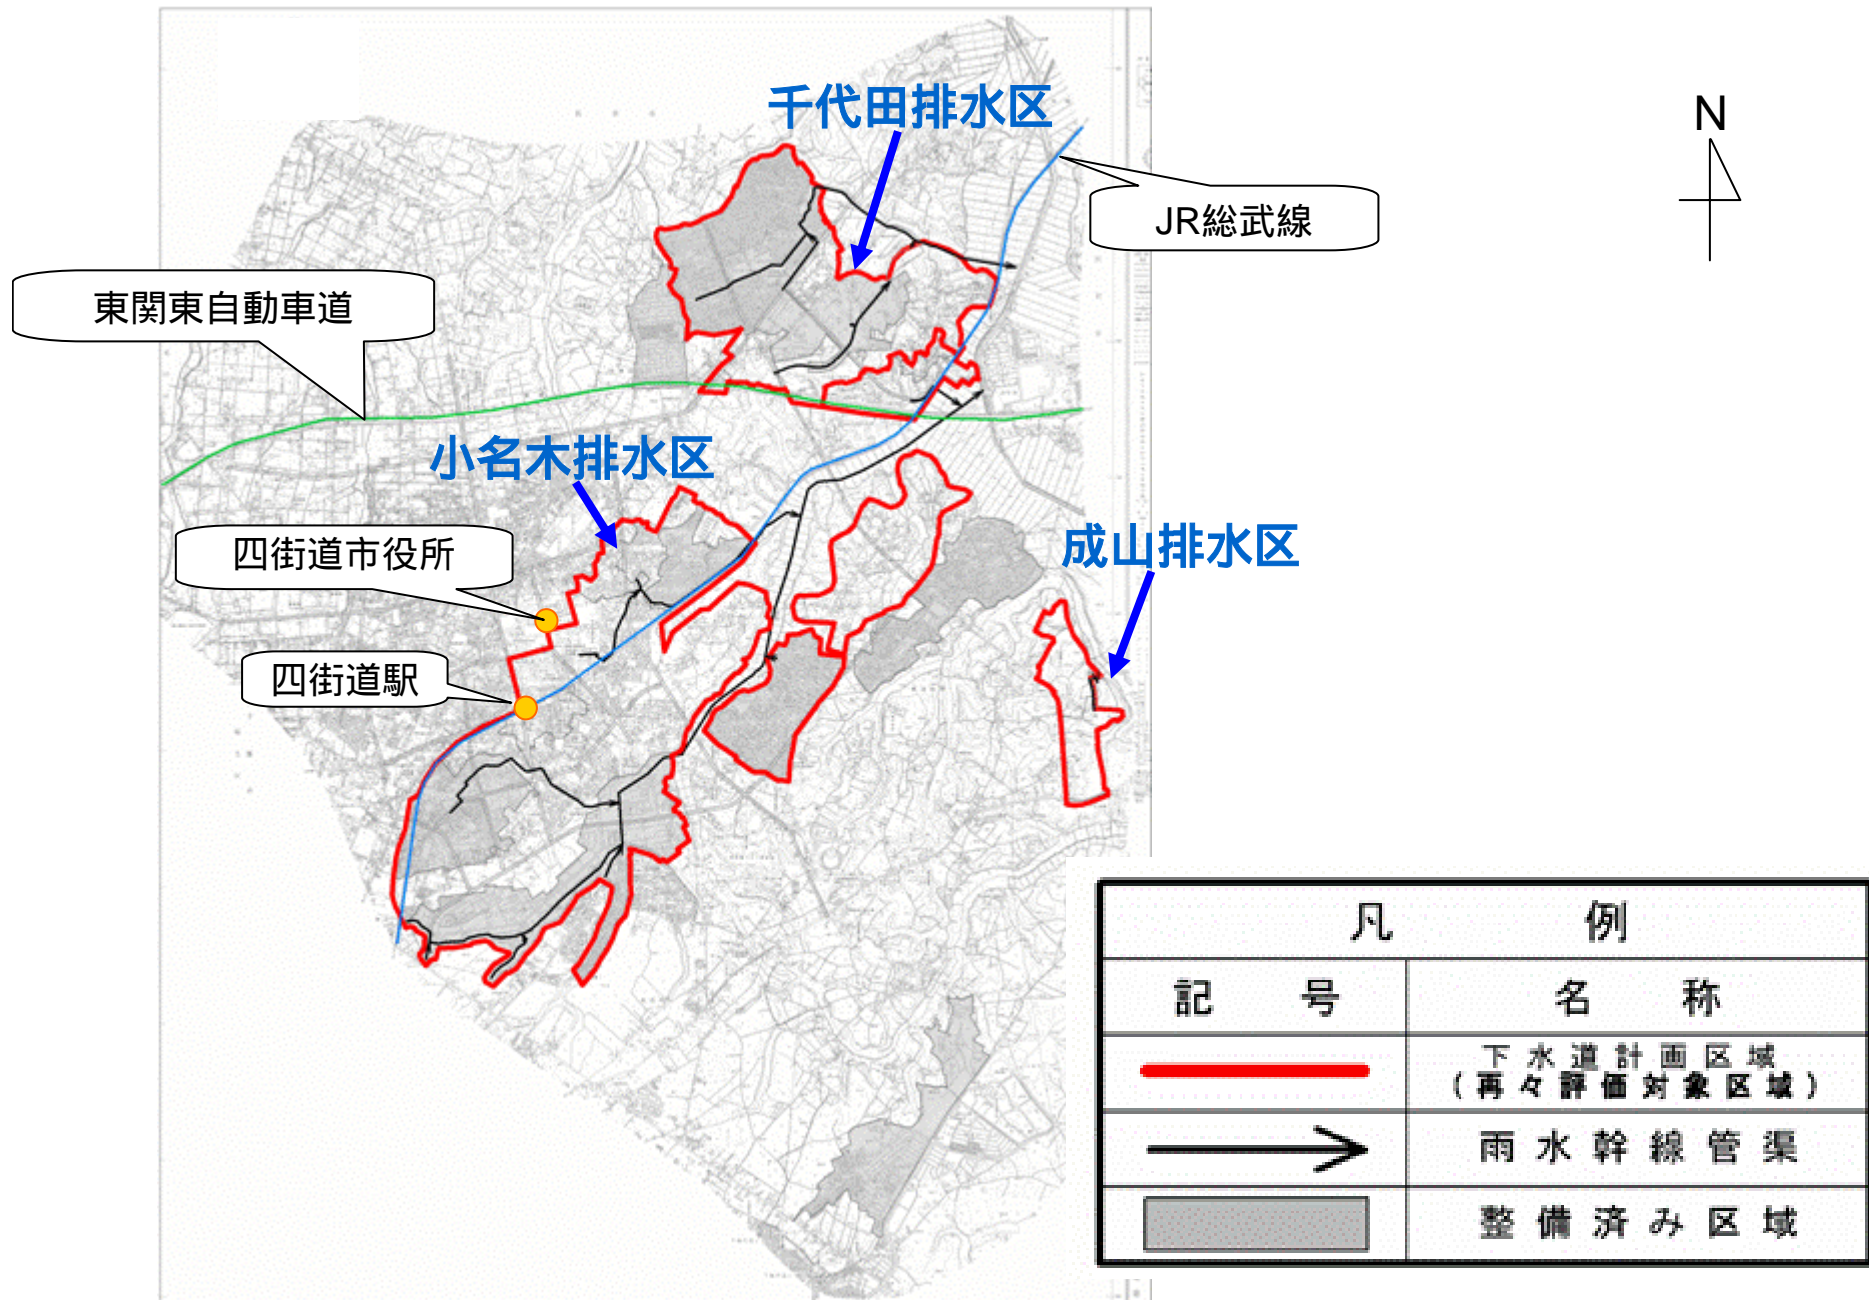


## 指標1 費用効果分析 (雨水)

総便益 ( B )	567億円
総費用 ( C )	380億円
費用便益費 ( B / C )	1.4 ~ 1.8

## 指標2 事業の進捗状況(雨水)

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画619haに対して352haを整備し、整備率は57%である。
地元情勢等	四街道市議会の理解及び地元住民の協力は得られている。

## 指標2 事業の進捗状況(雨水)

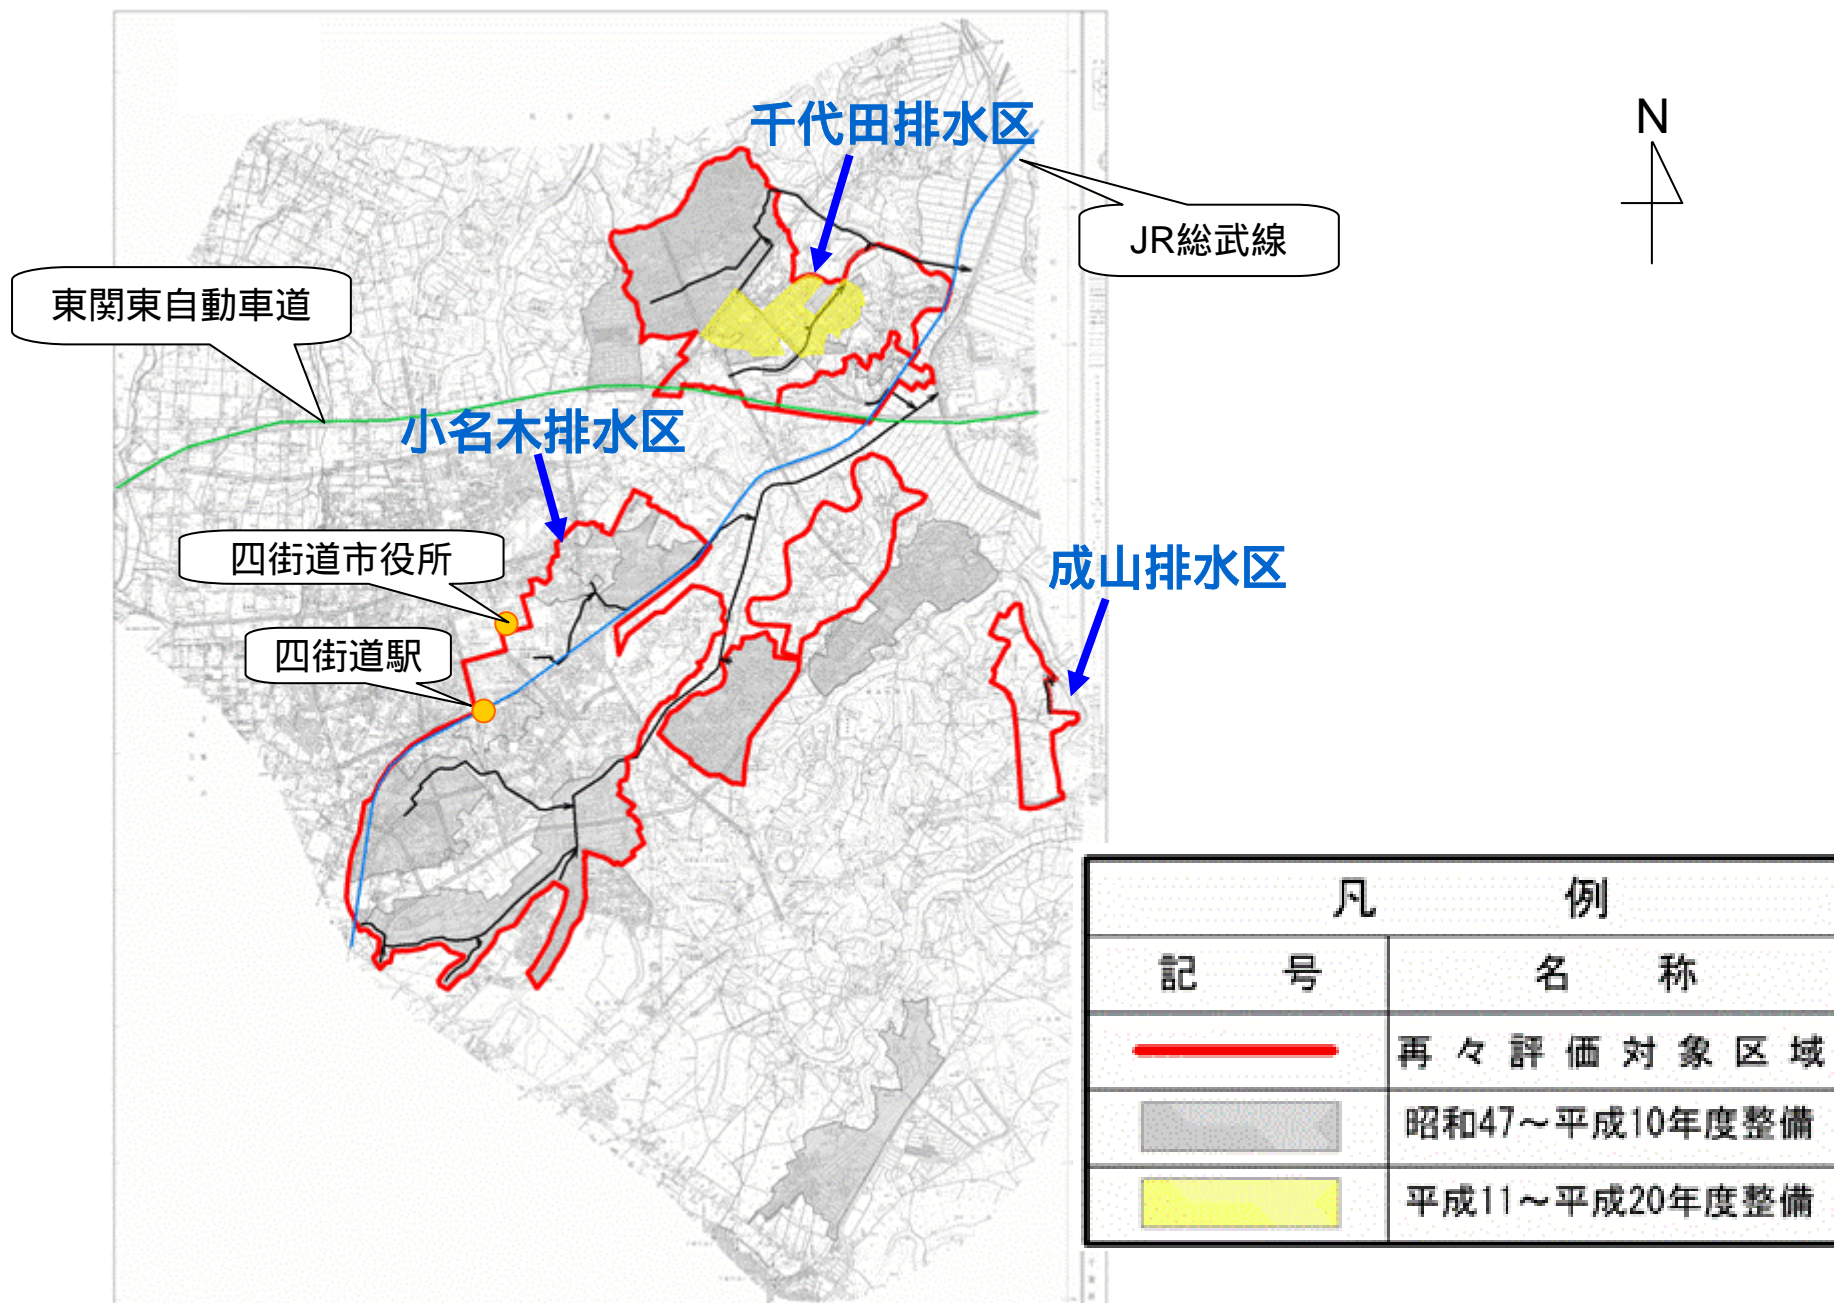

## 指標3 社会経済情勢等（雨水）

指 標	状 況
社会経済情勢	下水道事業に影響のある社会経済情勢の変化は特にない。
計画変更の有無及びその程度	全体計画及び事業計画について、必要に応じ適切に見直している。



## 指標4 コスト縮減・代替案(雨水)

指 標	状 況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。

## 対応方針(雨水)案

四街道市公共下水道事業(雨水)は、今後  
も整備が必要とされることから、当事業を  
継続していく方針です。
