


# 銚子市公共下水道事業 事業再々評価

平成 20 年 11 月  
千葉県 銚子市

# 銚子市の概要

銚子市は千葉県の北東部に位置する農漁業・商工業・観光都市で、北は利根川、東と西は太平洋に面している。

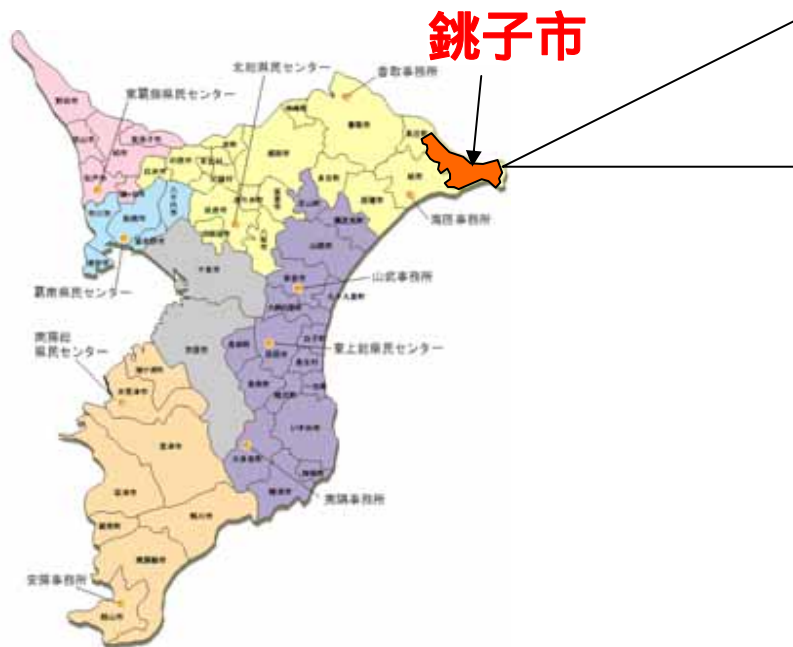

# 事業の必要性(汚水)



【汚水】


生活環境の改善

公共用水域の水質保全

● 漁業や観光産業に活用



# 下水道事業の概要(汚水)

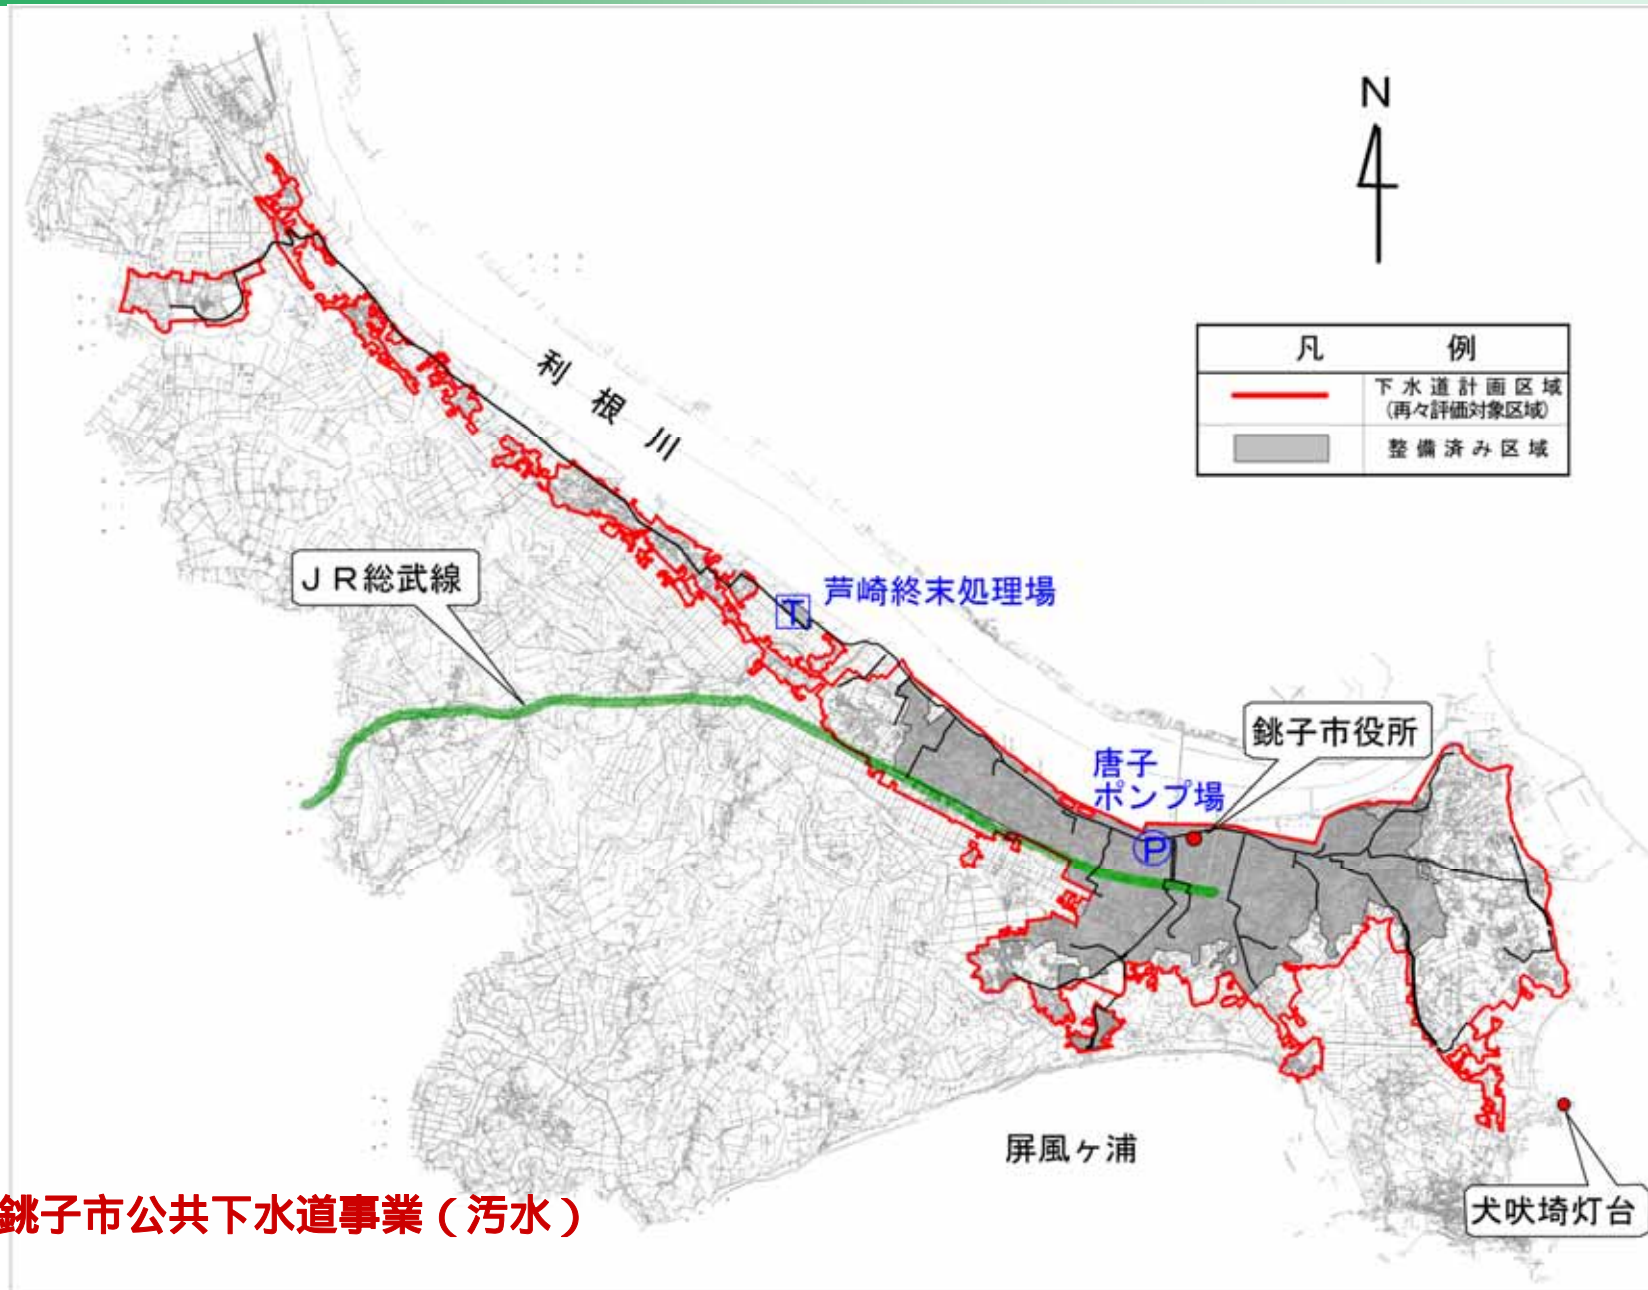


## 指標1 費用効果分析(汚水)

総便益 ( B )	1,360億円
総費用 ( C )	987億円
費用便益比 ( B / C )	1.4

## 指標2 事業の進捗状況(汚水)

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画895haに対して、691haを整備し、整備率は77%である。
処理場用地の取得状況	全用地を取得済みである。
処理施設の供用状況	事業計画の処理能力32,000m <sup>3</sup> /日に対し、24,000m <sup>3</sup> /日を整備し、整備率は75%である。
供用開始区域の接続状況	接続率は72%である。
地元情勢等	地元住民の協力は得られている。

# 指標2 事業の進捗状況(汚水)

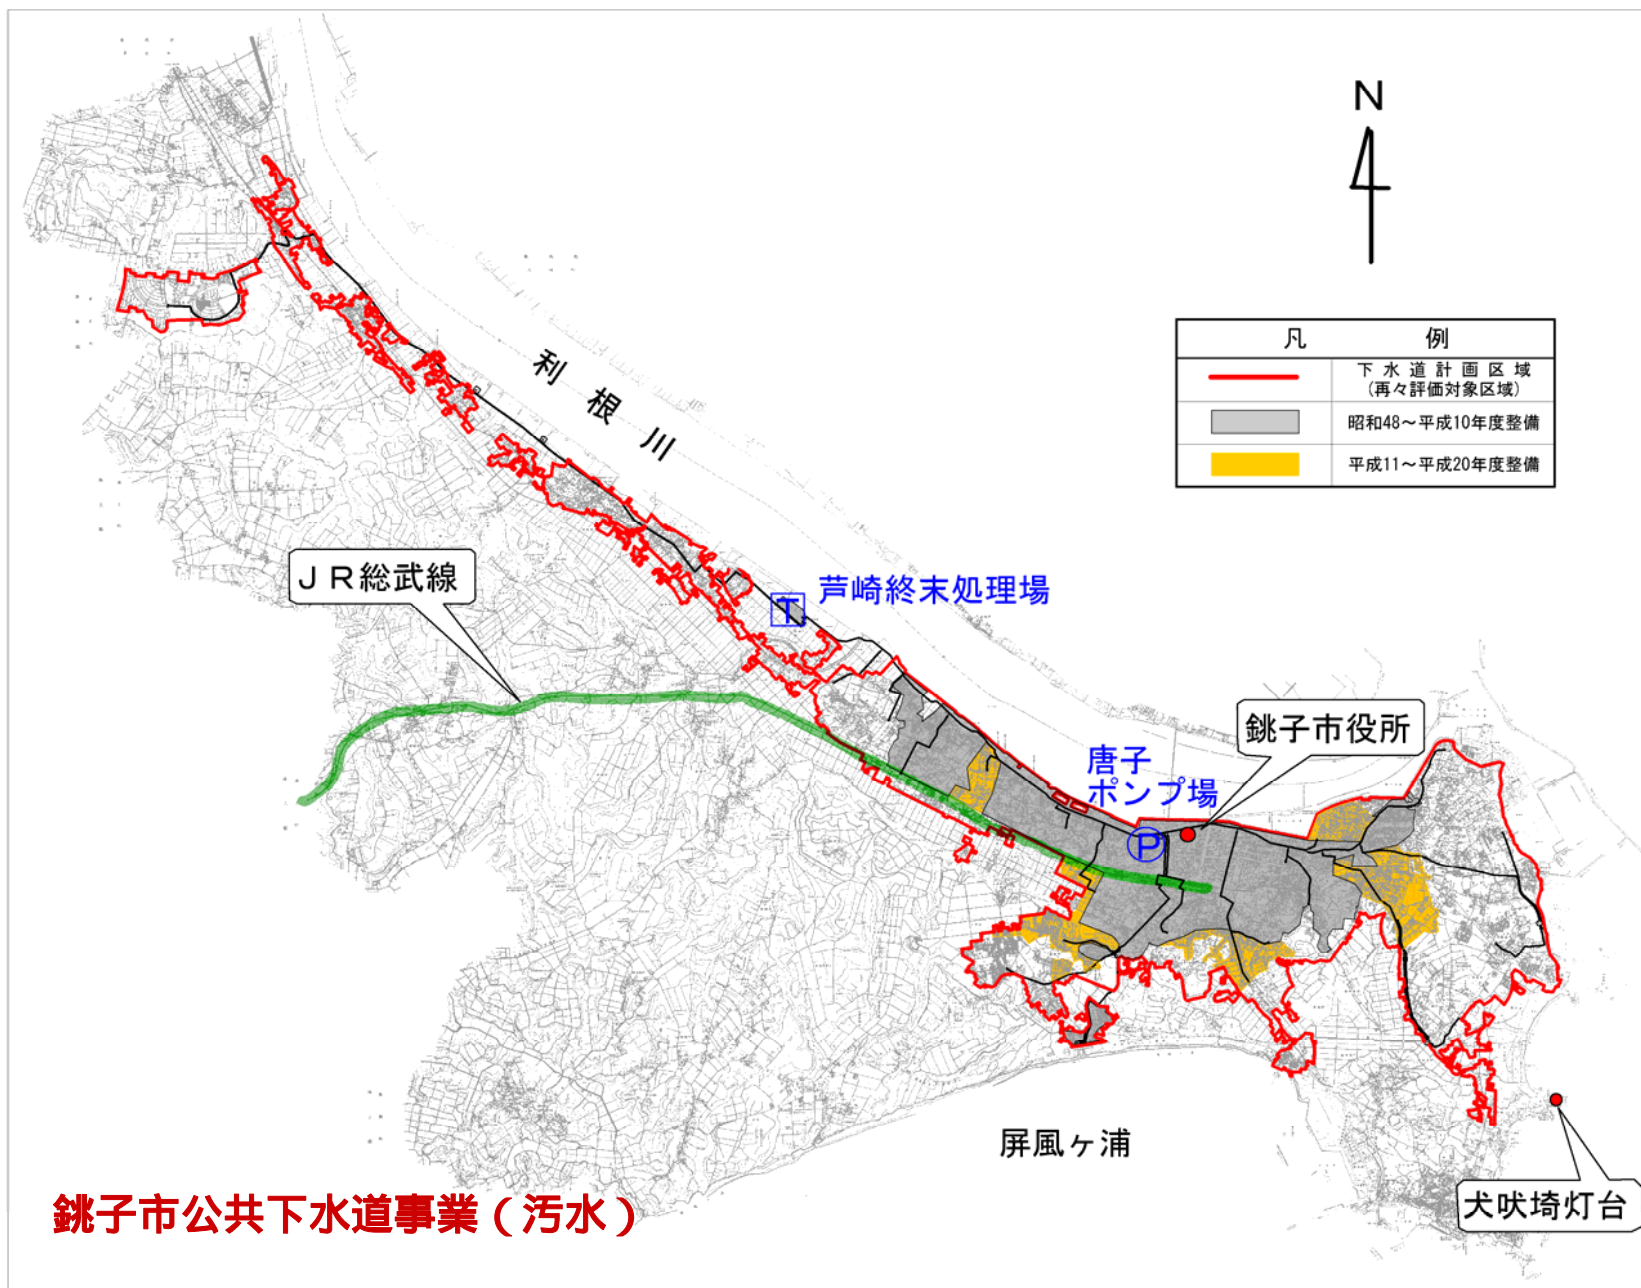

## 指標3 社会経済情勢等(汚水)

指 標	状 況
社会経済情勢	下水道事業に影響のある社会経済情勢の変化は特 ない。
自然環境条件	利根川の水質汚濁に係わる水質環境基準に変更はな い。
計画変更の有無及びその 程度	全体計画及び事業計画について、必要に応じ適切に見 直している。



## 指標4 コスト縮減・代替案(汚水)

指 標	状 況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。
代替案	当市の市街化の状況から、下水道整備が最適。

## 対応方針(汚水)案


銚子市公共下水道事業(汚水)は順調に進展しており、今後も順調な進展が見込まれることから、当事業を継続していく方針です。

# 事業の必要性(雨水)




【雨水】

浸水による被害から住民の安全と財産を守る。

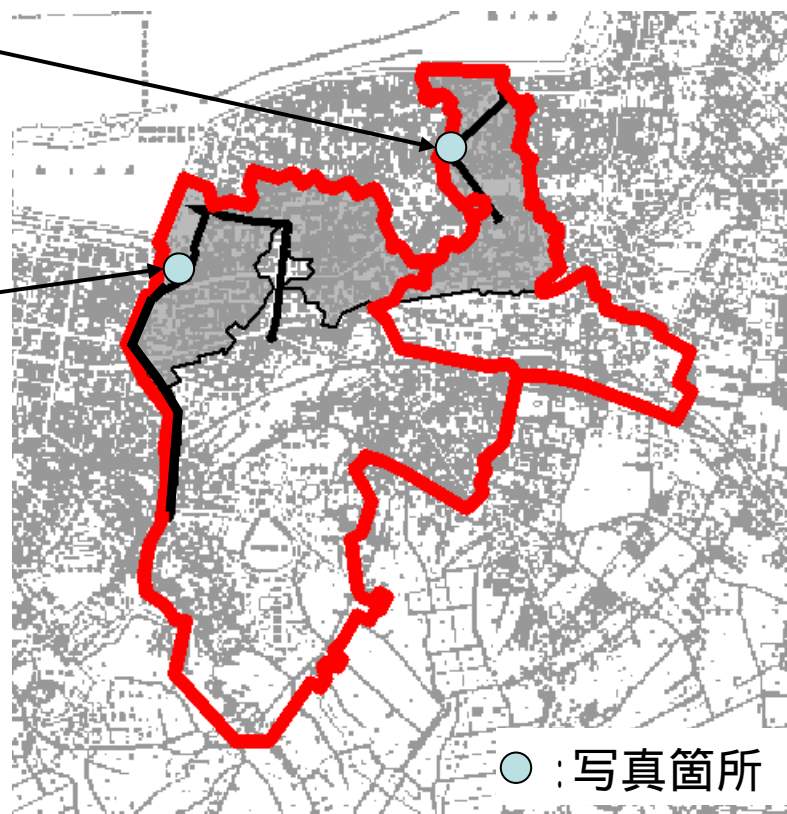

● : 写真箇所

# 下水道事業の概要(雨水)

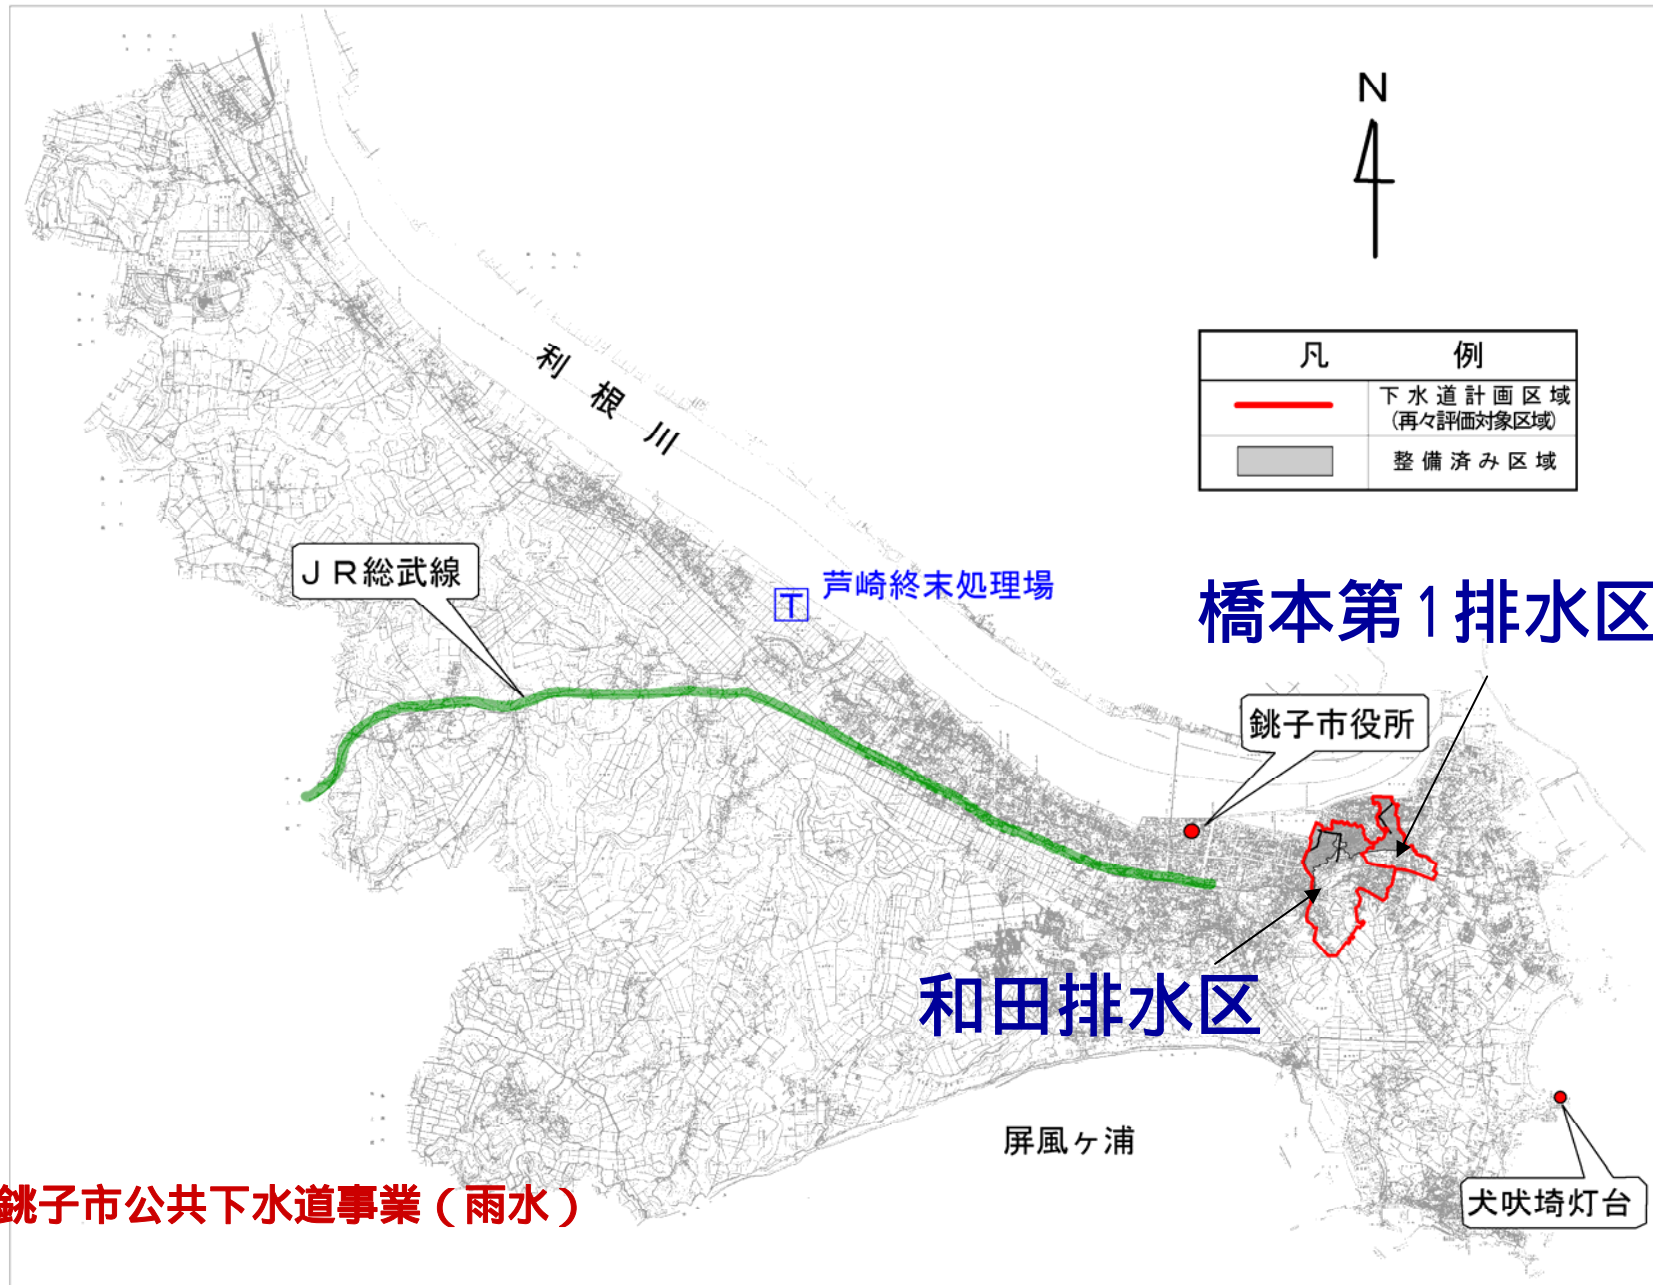

銚子市公共下水道事業(雨水)


## 指標1 費用効果分析(雨水)

総便益 ( B )	32億円
総費用 ( C )	24億円
費用便益比 ( B / C )	1.3 ~ 1.6

## 指標2 事業の進捗状況(雨水)

指標	状況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画71haに対して36haを整備し、整備率は51%である。
地元情勢等	地元住民の協力は得られている。

# 指標2 事業の進捗状況(雨水)

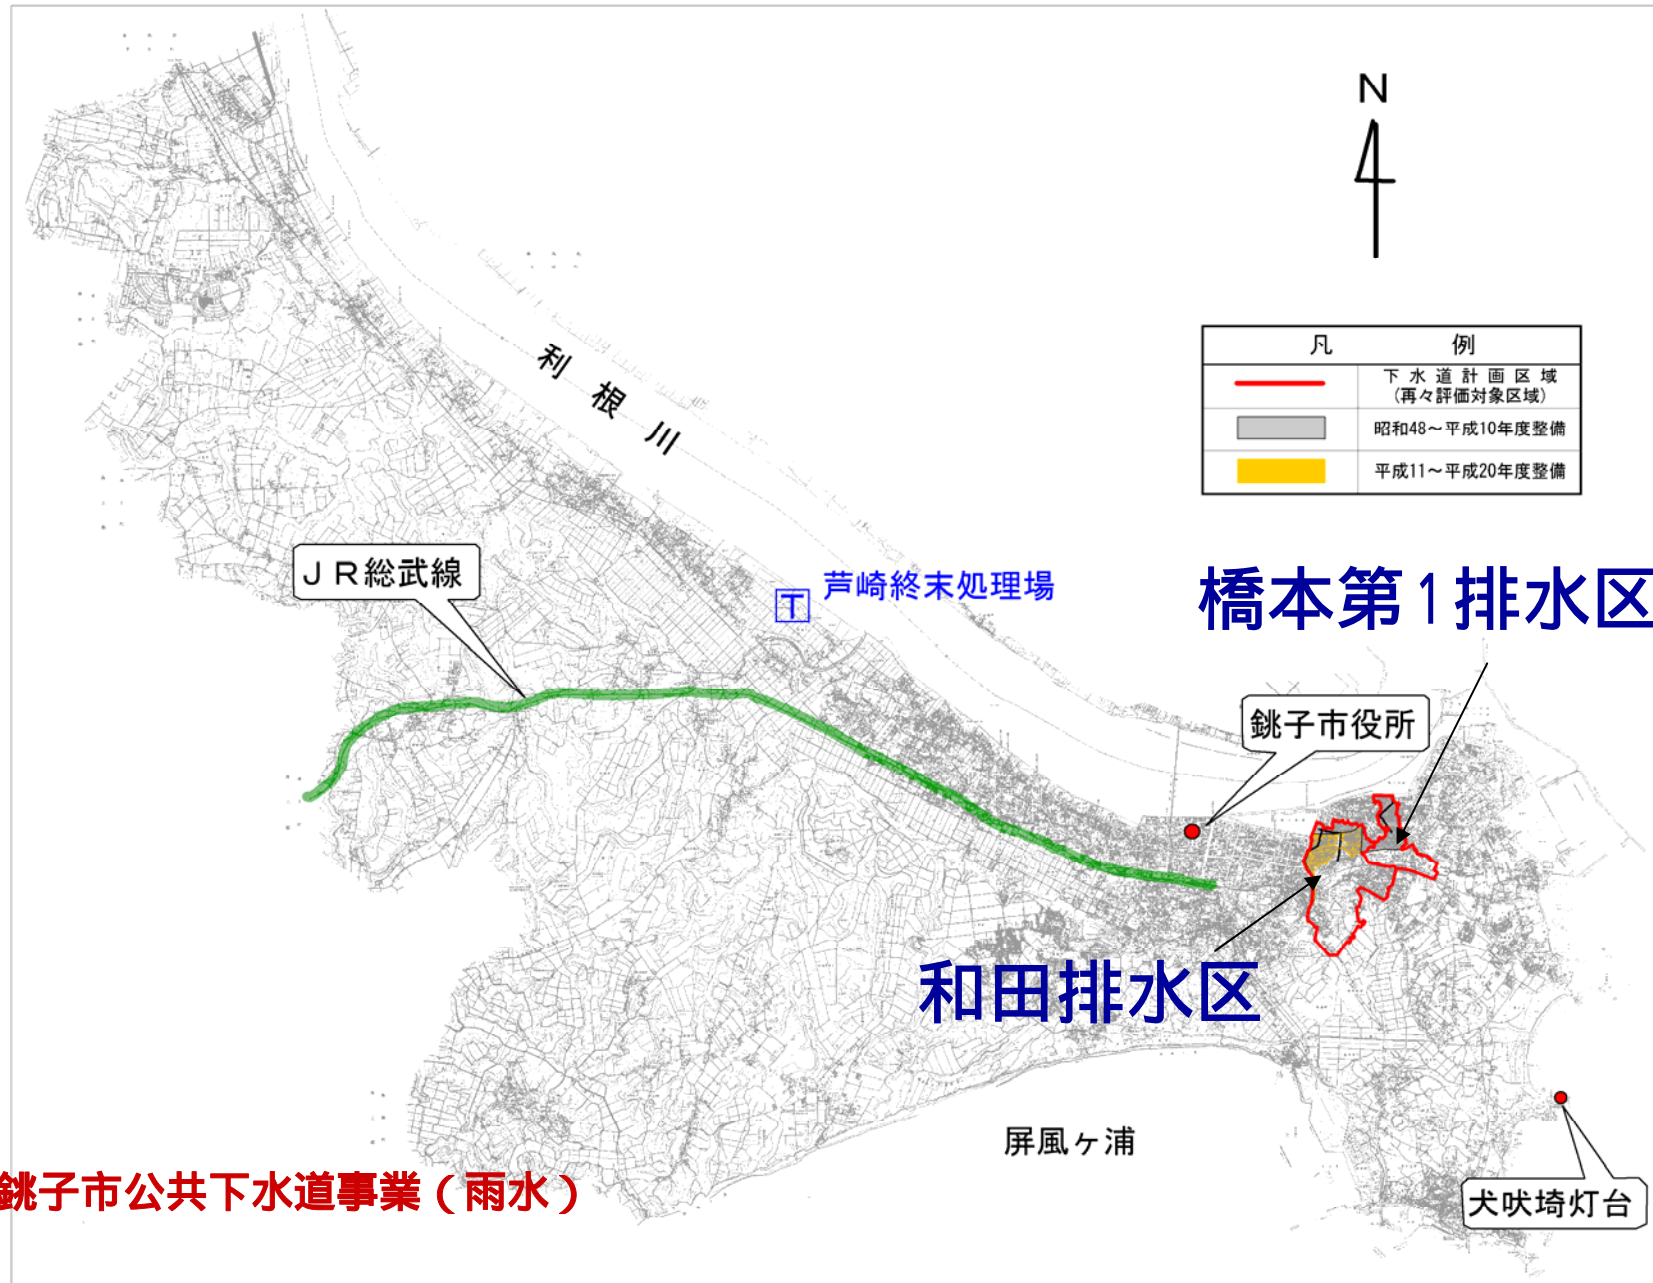

# 対応方針(雨水)案

銚子市公共下水道事業(雨水)は今後も引き続き整備が必要であることから、当事業を継続していく方針です。
