

## 【別紙様式3】

## 再評価実施事業調査書

番号	6	事業名	海岸環境整備		路線又は箇所名等		富山海岸（南房総市）			
事業所管課		河川整備課		事業主体			千葉県			
事業化年度	平成12年	用地着手年度	—	工事着手年度	平成12年	工事終了(認可)年度	平成23年	再評価の理由		②
費用便益比 B/C	1.3	総費用	14億円	総便益	18億円	基準年	平成21年	供用開始 年度	平成21年	

## 【事業概要】

(目的) 国土の保全及び安全で快適な海浜利用の増進に資するため、海岸環境の整備を図る。  
 (実施内容) 突堤工 400m(2基) 養浜工 10万 m<sup>3</sup>  
 利便施設 一式(トイレ2箇所 広場造成 2,650m<sup>2</sup>)

## 【事業の進捗状況】

	全体計画(億円)	投資事業費(億円)	進捗率(%)
全体	10	7.98	79.8
工事	10	7.98	79.8

(実施済み内容) 突堤工 390m(2基) 養浜工 2.7万 m<sup>3</sup>  
 利便施設 一式(トイレ2箇所 広場造成 2,650m<sup>2</sup>)

## 【社会経済情勢等】

## ①海岸状況

南房総市(旧富山町)に位置する富山海岸は風光明媚な観光名所になっている。地形的には典型的なポケットビーチを形成し、遠浅であり、海水浴等の海岸利用に適しているほか、当海岸の背後では駐車場等の整備が計画されるなど、将来的に海岸を含めたレクリエーションエリアとしての整備の要請が高まる一方、砂浜の侵食及びそれに伴う越波の危険性の増大や飛砂の影響などが顕在化しつつあったことから、当海岸では海浜利用ならびに優れた景観の形成も考慮できる侵食対策としての施設の整備を実施している。

## ②災害状況

なし

## ③その他

## (1) 関連事業

岩井海岸整備基本計画、岩井海岸駐車場確保事業(計画)、高崎漁港整備(計画)、町道市部久枝線道路改良事業(実施)、三笠橋梁整備事業(完了)、町道仙水松原線道路改良事業(実施)

## (2) 地域の協力体制

地元住民代表、漁業関係者、県・町の関係者が中心となって岩井海岸事業説明会を開催し、関連事業の調整を図りながら整備の推進を図っている。

その他、南房総市(旧富山町)ではゴミ0(ゼロ)運動が町民の自主的な運営のもとで行われており、海岸でも月2回の「浜掃除」が行われている。夏の間は、ビーチクリーナーが毎日出動し流れ着く砂浜のゴミを処理している。

## (3) その他

海水浴場として年間10~20万人の入込み客数がある海岸であるとともに、多様な海岸利用(臨海学校、観光地引き網、バーベキュー、ライフセービング教室、ビーチサッカー大会等)も行われている。

## 【対応方針(案)】

今後の整備展開については、地元関係者と協議のもと、海域環境への影響や海浜利用に配慮した施設計画に適宜修正し、早急な安全度向上とコスト縮減、および、環境負荷の低減を図っていく。

海岸の利便施設整備は、市の駐車場整備等と一体となり海浜地域の特性を生かした整備を進めていることから、事業継続とする。

南突堤および養浜工は暫定形状であるが、モニタリングによると海浜においては安定傾向が確認されることから、コスト縮減に鑑み、今後の整備については防護効果を確認しながら進めていくこととする。

事業概要図

番号	6	事業名	海岸環境整備	路線又は箇所名等	富山海岸（南房総市）
----	---	-----	--------	----------	------------

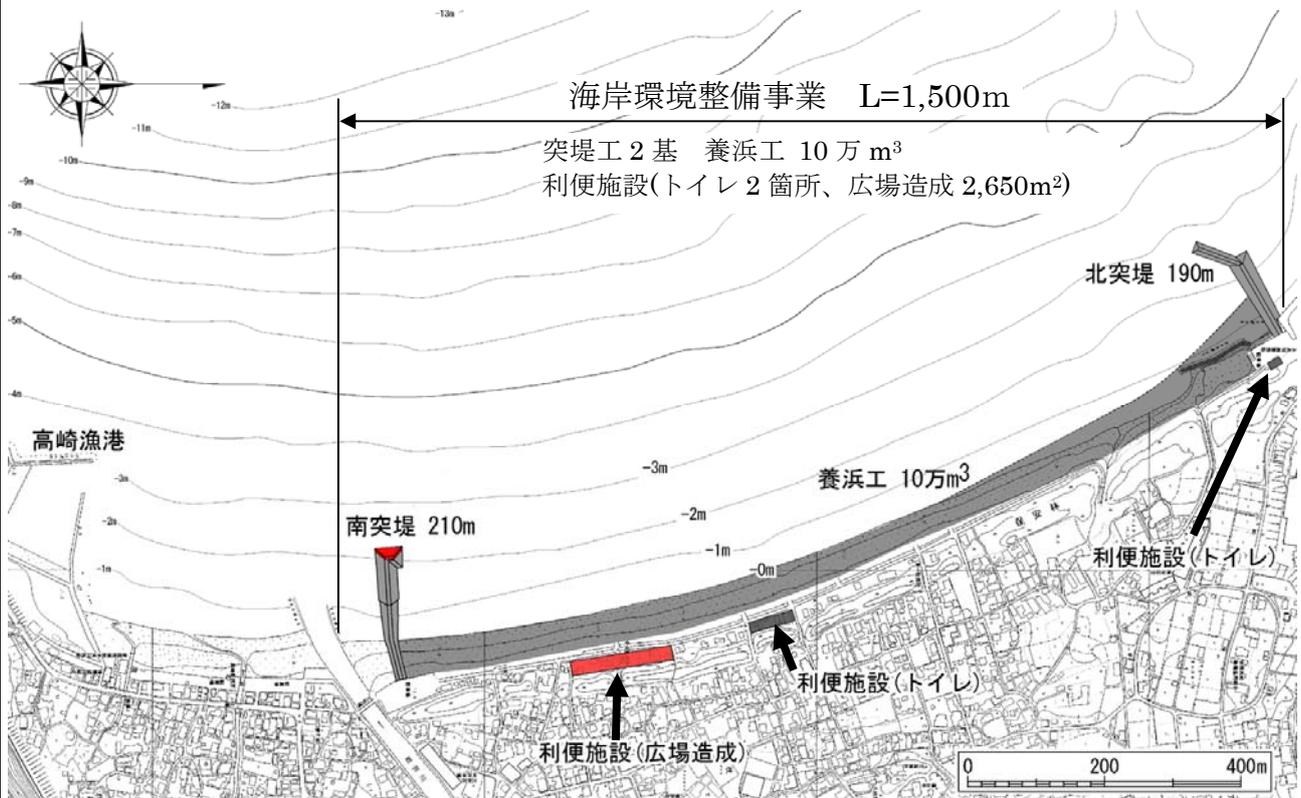


図-1 全体平面図

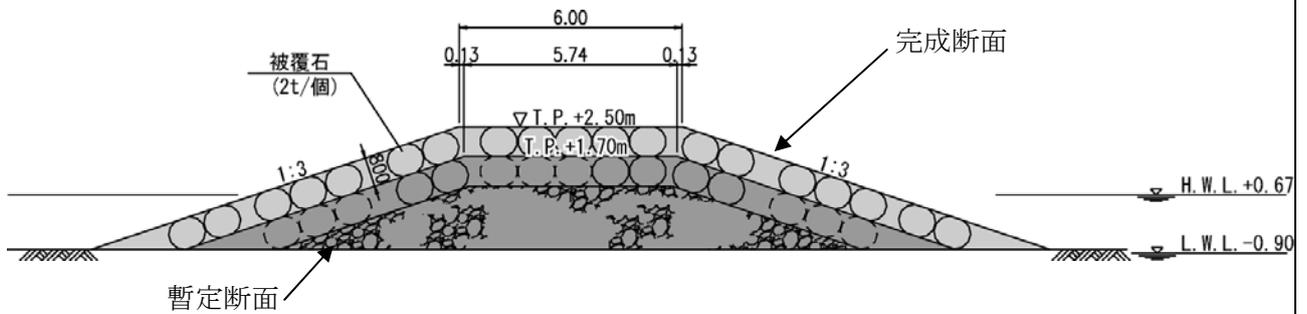


図-2 突堤標準断面図




図-3 養浜工標準断面図
