令和6年3月末現在

江戸川左岸流域下水道計画の全体図

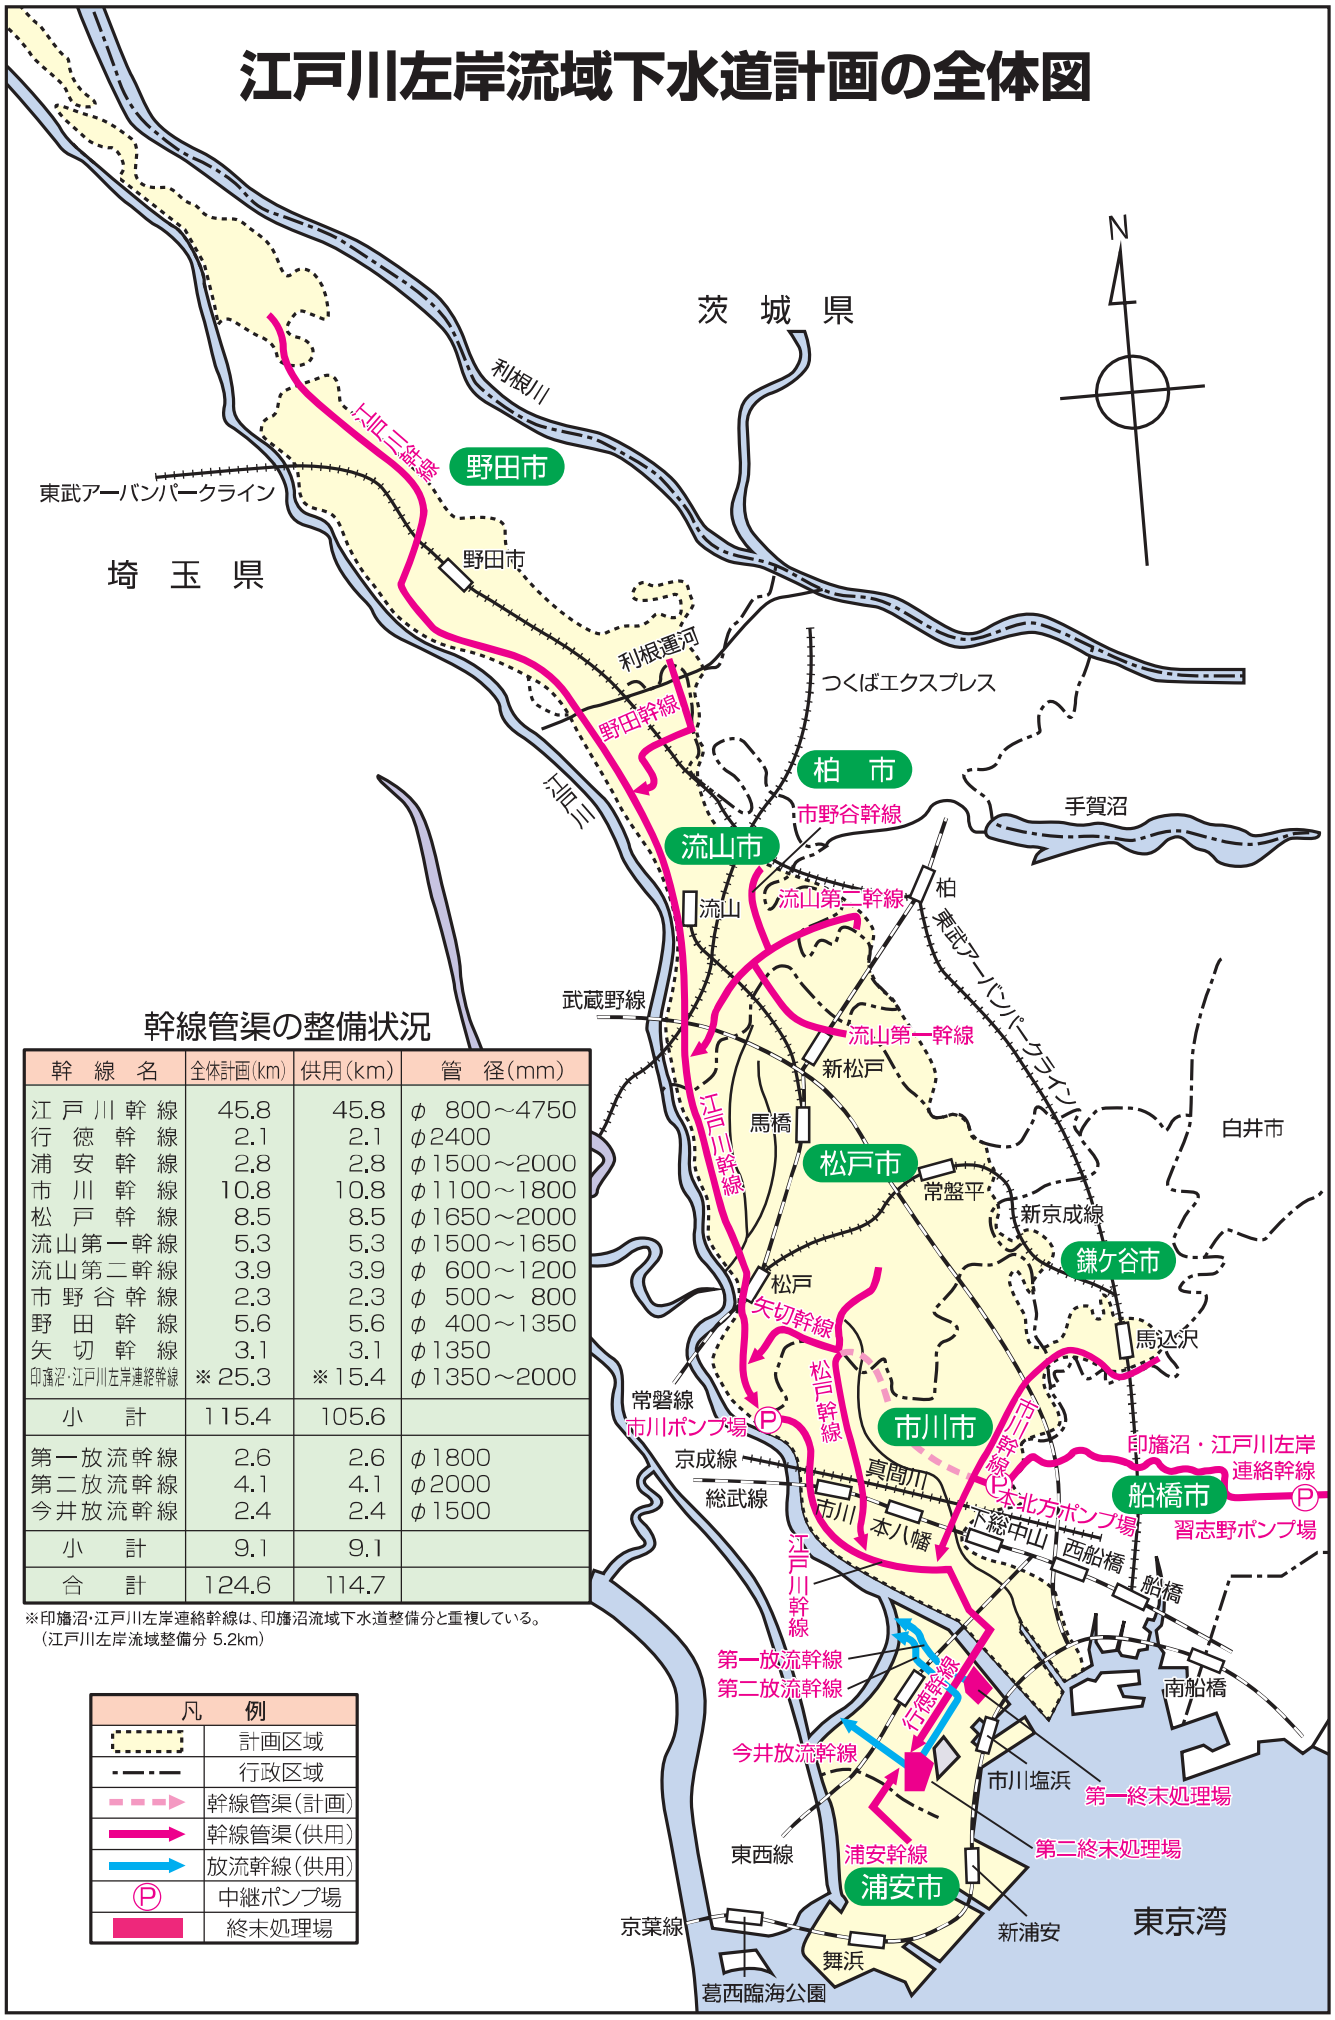

幹線管渠の整備状況

幹　線　名	全体計画(km)	供用(km)	管　径(mm)
江戸川幹線	45.8	45.8	φ 800～4750
行徳幹線	2.1	2.1	φ2400
浦安幹線	2.8	2.8	φ1500～2000
市川幹線	10.8	10.8	φ1100～1800
松戸幹線	8.5	8.5	φ1650～2000
流山第一幹線	5.3	5.3	φ1500～1650
流山第二幹線	3.9	3.9	φ 600～1200
市野谷幹線	2.3	2.3	φ 500～ 800
野田幹線	5.6	5.6	φ 400～1350
矢切幹線	3.1	3.1	φ1350
印旛沼・江戸川左岸連絡幹線	※25.3	※15.4	φ1350～2000
小　計	115.4	105.6	
第一放流幹線	2.6	2.6	φ1800
第二放流幹線	4.1	4.1	φ2000
今井放流幹線	2.4	2.4	φ1500
小　計	9.1	9.1	
合　計	124.6	114.7	

※印旛沼・江戸川左岸連絡幹線は、印旛沼流域下水道整備分と重複している。
（江戸川左岸流域整備分 5.2km）

凡　例	
	計画区域
	行政区域
	幹線管渠(計画)
	幹線管渠(供用)
	放流幹線(供用)
Ⓟ	中継ポンプ場
	終末処理場
