

週休2日制適用工事（漁港漁場関係工事）試行要領（令和5年10月版）

1 目的

建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められている。このため、千葉県では、将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取り組みとして、週休2日制適用工事を試行する。この要領は、適用工事の試行に関し必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。

2 用語の定義

(1) 適用工事

現場閉所による週休2日工事及び週休2日交替制工事の総称をいう。

(2) 現場閉所による週休2日工事

1) 週休2日

4週8休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。

2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3) 対象期間

現場着手日以降の最初の土曜日（又は月曜日）から現場完成日までにおける1期間（4週間）を最小単位とした期間をいう。対象期間については、契約後、受発注者で協議して定めることとする。

4) 現場着手日

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日をいう。

5) 現場完成日

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。

(3) 週休2日交替制工事

1) 現場閉所

閉所日に品質確保や安全確保に係る軽微な作業、地域行事等（※）によりやむを得ず少数の出勤者が生じた場合は、当該出勤者が別日に代休を取得することにより、閉所とみなす。

※○品質確保や安全確保に係る軽微な作業の例

コンクリートの養生（散水作業）を行う場合、コンクリートの強度確認のみを行う場合、交通誘導員（安全監視船）のみ稼働している場合、灯浮標等機器点検、ケーソン工事における送気用設備運転のみの稼働の場合、天候（気象・海象）により作業できない場合

○地域行事、現場見学会の開催の例

現場作業周辺の清掃作業、イメージアップ関連作業、現場作業が行われていない時の現場見学会

2) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での専務作業を含む）を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日を含めるものとする。

3) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）すべての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。

4) 対象期間

対象者が当該工事に従事した期間をいう。

(4) 共通

1) 対象期間外

①年末年始休暇（土曜日、日曜日、祝日を含む）6日間、

夏季休暇（土曜日、日曜日、祝日以外の8月）3日間

祝日（国民の祝日）

②工場製作のみを実施している期間

③工事全体を一時中止している期間

2) 4週8休

各期間において8日間以上の現場閉所日があることをいう。

ただし、1期間以内に祝休日（祝日、年末年始休暇、夏期休暇）がある場合は、8日間（土曜日、日曜日）に祝休日の日数を加えた現場閉所日があることとする。

3 対象工事

適用工事は、農林水産部水産局が所掌する漁港漁場関係工事（営繕関係工事は除く）を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。

- ・現場施工が1期間（4週間）未満の工事
- ・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事）

4 発注方式

現場閉所による週休2日工事を原則とするが、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休2日交替制工事とすることができる。なお、いずれの場合においても発注者指定型とする。

また、現場閉所による週休2日工事として発注した場合において、受注者が週休2日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休2日交替制工事に変更することができるものとする。

5 工事費の積算

週休2日の補正係数（別紙1）を各経費等に乗じる。

発注時は4週8休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ減額変更する。

土木工事市場単価の補正については、県土整備部の週休2日制適用工事試行要領（令和4年10月版）別紙1の補正係数を各経費等に乗じる。ただし、週休2日交代制工事の補正係数及び4週6休・4週7休の補正係数は適用対象外とする。なお、積算基準が異なる複数工種区分を有する工事の間接工事費率は、主たる工種（金額の割合が最も高い工種）を適用するものとする。

6 実施方法

(1) 条件明示等

発注者は、特記仕様書に適用工事である旨を、別紙2のとおり記載すること。

また、公告時等に、工事工程表を添付すること。工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

(2) 受注者による意思表示

受注者は、工事契約後、発注者が示した工事工程表をもとに、受発注者間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期、工事工程のクリティカルパス等を共有し、現場着手前に監督員と週休2日の取組方式と対象期間について工事打合せ簿により協議すること。また、対象期間内における現場閉所予定日又は休日予定がわかる工程表等（以下、「工程表等」という。）を監督職員に提出すること。

(3) 工事看板による表示

受注者は、対象期間中、週休2日制適用工事を実施している旨を、工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示することとする（別紙3）。

(4) 実施報告

受注者は、毎月の工事履行報告書（別紙4）と併せて、現場閉所チェックリスト（別紙5）又は、休日確保状況チェックリスト（別紙6）を監督職員に提出すること。また、チェックリストの確認用に、現場閉所日や休日を確認できる書類（作業日報等）を監督職員に提示すること。

対象期間終了後は、速やかに最終月の週休2日制の取り組みが確認できる工事履行報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。

なお、現場完成日が工期期限に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき設計変更を行うものとする。

(5) 工期変更時の対応

工程に変更が生じた場合は、その要因と変更後の工事工程について、受発注者間で協議すること。なお、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うこと。

- ① 工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合
- ③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

工期の変更を行った場合、受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間について監督職員に協議する。

7 工事成績

週休2日制を実施できなかったことによる工事成績評定点の減点はない。

8 その他

監督職員は、この要領に定めのない事項又はこの要領に疑義を生じた事項については、主務課と協議すること。

附 則

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

○各補正係数

・現場閉所による週休2日工事、週休2日交替制工事の補正

| | 労務費 | 機械経費(賃料) | 共通仮設費率 | 現場管理費率 |
|--------------|------|----------|--------|--------|
| 港湾土木請負工事積算基準 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 土木工事標準積算基準 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |

○市場単価方式の補正係数について

| No | 名称 | 市場単価補正係数 |
|----|--------------------------------|----------|
| 1 | 底面工 | 1.04 |
| 2 | マット工 (アスファルトマット設置) | 1.01 |
| 3 | 支保工 | 1.05 |
| 4 | 足場工 | 1.03 |
| 5 | 鉄筋工 | 1.05 |
| 6 | 吊鉄筋工 | 1.05 |
| 7 | 型枠工 | 1.04 |
| 8 | コンクリート打設工 (ポンプ車打設) | 1.05 |
| | コンクリート打設工 (ポンプ車打設以外) | 1.05 |
| 9 | 止水版工 | 1.05 |
| 10 | 上蓋工 | 1.05 |
| 11 | 伸縮目地工 | 1.03 |
| 12 | 係船柱取付 | 1.05 |
| 13 | 防舷材取付 | 1.05 |
| 14 | 車止・縁金物取付 | 1.05 |
| 15 | 係船柱撤去 | 1.05 |
| 16 | 防舷材撤去 | 1.05 |
| 17 | 車止撤去 | 1.05 |
| 18 | 電気防食取付 | 1.05 |
| 19 | 防砂目地版取付工 (陸上施工) | 1.05 |
| 20 | 防砂目地版取付工 (水中施工) | 1.04 |
| 21 | 吸出し防止工 (陸上施工・海上施工) | 1.04 |
| 22 | 港湾構造物塗装工 (係船柱・車止・縁金物) | 1.04 |
| 23 | ペトロラタム被覆 | 1.05 |
| 24 | 現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工・海上施工) | 1.05 |
| 25 | 現場鋼材溶接・切断工 (水中施工) | 1.05 |
| 26 | かき落とし工 | 1.05 |
| 27 | 汚濁防止膜設置・撤去・移設 | 1.04 |
| 28 | 汚濁防止枠設置・撤去 | 1.03 |
| 29 | 灯浮標設置・撤去 | 1.04 |
| 30 | 汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船あり・水中目視点検) | 1.01 |
| | 汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船なし) | 1.05 |
| 31 | 異形ブロック製作 型枠工 | 1.05 |
| | 異形ブロック製作 コンクリート打設工 | 1.05 |

○特記仕様書記載例

(週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事)【現場閉所による週休2日工事】)

第〇条 本工事は、週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事)である。


- 2 受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- 3 受注者が週休2日交代制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休2日交代制工事に変更することができる。
- 4 週休2日制の実施にあたっては、「週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事) 試行要領(令和5年10月版)」に基づき行うこと。

(週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事)【週休2日交代制工事】)

第〇条 本工事は、週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事)である。

- 2 受注者は、週休2日交代制工事として取り組むこと。なお、予定価格には4週8休達成相当の経費を補正している。
- 3 週休2日制の実施にあたっては、「週休2日制適用工事(漁港漁場関係工事) 試行要領(令和5年10月版)」に基づき行うこと。

○公衆が見やすい場所への明示例

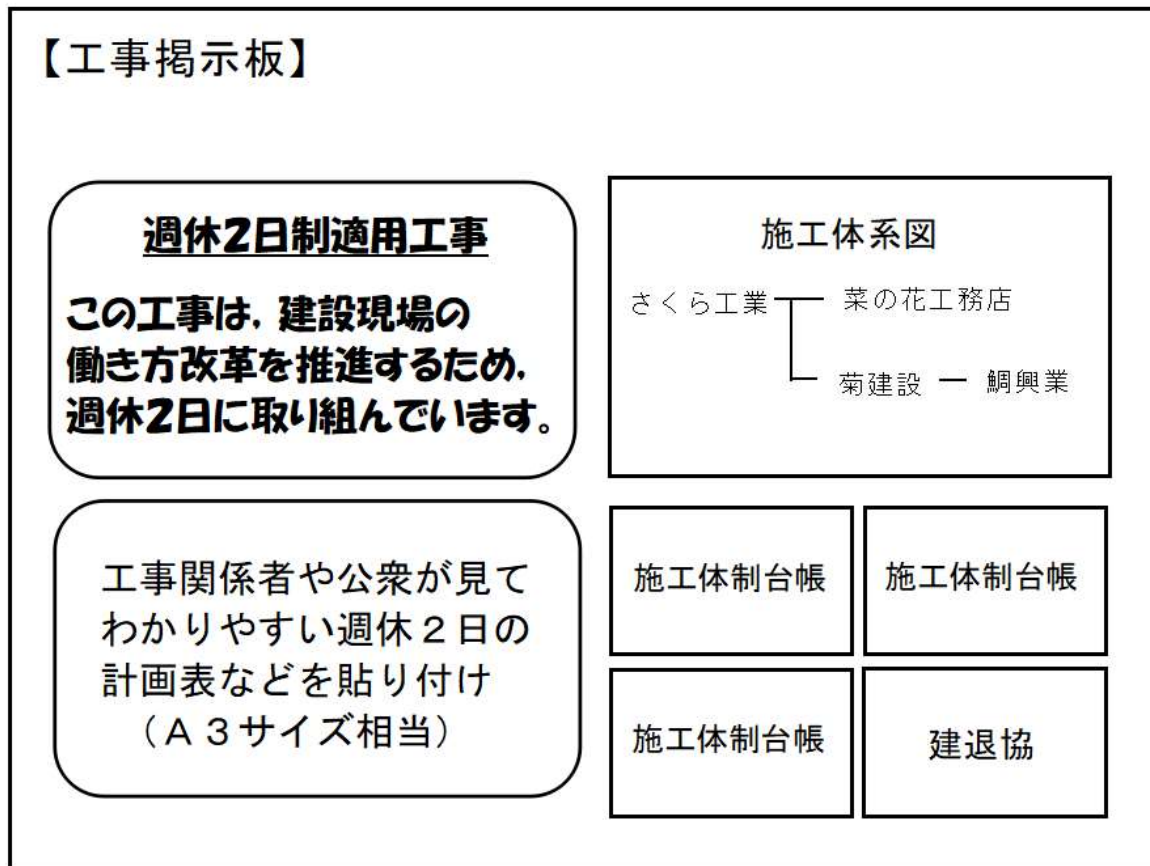

工 事 履 行 報 告 書

別紙4

| | | | | |
|--|----------------------|--------|----------|----|
| 工事名 | | | | |
| 漁港名 | | | | |
| 工 期 | 令和○年○月○日 | ～ | 令和○年○月○日 | |
| 日 付 | 令和○年○月○日 (○月度) | | | |
| 月 別 | 予定工程 % () は工程変更後 | 実施工程 % | 進捗状況 日 | 備考 |
| ○月 | % | % | ±○ | |
| ○月 | % | % | ±○ | |
| ○月 | % | % | ±○ | |
| ○月 | % | % | ±○ | |
| ○月 | % | % | ±○ | |
| ○月 | % | | ±○ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (記事欄) | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">記載例</div> <p>【週休2日制適用工事】 ○期間目の休日日数 ○日 / 休日取得日数 ○日</p> | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|
| 総括 監督員 | 主任 監督員 | 監督員 | 監督員 |
| | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 現場 代理人 | 主任 技術者 |
| | |

週休2日制適用工事 現場閉所チェックリスト（土曜日起算例）

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

※現場着手日が7月1日の場合

| 期間 | 月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 |
|-------|-------|-------|-------------|------------|--------------------------------|
| 対象外 | 7月1日 | 金 | | | |
| 1期間目 | 7月2日 | 土 | | | |
| | 7月3日 | 日 | | | |
| | 7月4日 | 月 | | | |
| | 7月5日 | 火 | | | |
| | 7月6日 | 水 | | | |
| | 7月7日 | 木 | | | |
| | 7月8日 | 金 | | | |
| | 7月9日 | 土 | | | |
| | 7月10日 | 日 | | | |
| | 7月11日 | 月 | | | |
| | 7月12日 | 火 | | | |
| | 7月13日 | 水 | | | |
| | 7月14日 | 木 | | | |
| | 7月15日 | 金 | | | |
| | 7月16日 | 土 | | | |
| | 7月17日 | 日 | | | |
| | 7月18日 | 月 | | | |
| | 7月19日 | 火 | | | |
| | 7月20日 | 水 | | | |
| | 7月21日 | 木 | | | |
| | 7月22日 | 金 | | | |
| | 7月23日 | 土 | | | |
| | 7月24日 | 日 | | | |
| | 7月25日 | 月 | | | |
| | 7月26日 | 火 | | | |
| | 7月27日 | 水 | | | |
| | 7月28日 | 木 | | | |
| | 7月29日 | 金 | | | |
| | 2期間目 | 7月30日 | 土 | | |
| 7月31日 | | 日 | | | |

| | | | |
|------|------|--------|------|
| | 休日日数 | 休日取得日数 | 判定 |
| 1期間目 | 9 | 9 | 4週8休 |

4週8休の確認方法（土曜日起算）

- ① 起算日は、工事着手日以降の最初の土曜日からとし、4週間を1期間とする（4週間単位で確認）
- ② 1期間（4週間）内に土曜日、日曜日以外の休日がない場合では、その期間に8日間の閉所日があることを確認する。
- ③ 1期間（4週間）内に祝休日が1日ある場合では、その期間に9日間の閉所日があることを確認する（祝休日も評価対象）。
- ④ 工事着手日が月曜日から金曜日のいずれかの曜日となる場合は、工事着手日の週は評価対象としない（例えば、月曜日が工事着手日の場合では、その週の月曜日から金曜日までの5日間は評価対象としない。）
- ⑤ 工事完了日直前の1期間の末日となる金曜日までを評価対象とし、それ以降の期間は評価対象としない（例えば、15週目の火曜日が工事完了日の場合は、12週目の金曜日までを評価対象とし、13週目の土曜日から15週目の火曜日までの18日間は評価対象としない）。

| | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|-------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| ① | | | 工事着手日 | | ④評価対象外 | | | |
| 1週間目 | 起算日 | | | | | | | |
| 2週間目 | | | | | | | | ② |
| 3週間目 | | | | | | 2週目土曜日分の閉所 | | 1期間目 |
| 4週間目 | | | | | 3週目土曜日分の閉所 | | 4週目日曜日分の閉所 | |
| 5週間目 | | | | 5週目土曜日分の閉所 | | | | |
| 6週間目 | | | | 6週目土曜日分の閉所 | | | | ③ |
| 7週間目 | | | 6週目日曜日分の閉所 | | | | 7週目土曜日分の閉所 | 2期間目 |
| 8週間目 | | | 祝日 | 祝日分の閉所 | | | 7週目日曜日分の閉所 | 3期間目 |
| 12週間目 | | | | | | | | |
| 13週間目 | | ⑤評価対象外 | | | | | | |
| 14週間目 | | ⑤評価対象外 | | | | | | |
| 15週間目 | | ⑤評価対象外 | | 工事完了日 | | | | |

作業日
 閉所日

4週8休の確認方法（月曜日起算）

- ① 起算日は、工事着手日以降の最初の月曜日からとし、4週間を1期間とする（4週間単位で確認）
- ② 1期間（4週間）内に土曜日、日曜日以外の休日がない場合では、その期間に8日間の閉所日があることを確認する。
- ③ 1期間（4週間）内に祝休日が1日ある場合では、その期間に9日間の閉所日があることを確認する（祝休日も評価対象）。
- ④ 工事着手日が火曜日から金曜日のいずれかの曜日となる場合は、工事着手日の週は評価対象としない（例えば、水曜日が工事着手日の場合では、その週の水曜日から日曜日までの5日間は評価対象としない。）
- ⑤ 工事完了日直前の1期間の末日となる日曜日までを評価対象とし、それ以降の期間は評価対象としない（例えば、15週目の木曜日が工事完了日の場合は、12週目の日曜日までを評価対象とし、13週目の月曜日から15週目の木曜日までの18日間は評価対象としない）。

| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------|
| ① | | | 工事着手日 | | ④評価対象外 | | | |
| 1週間目 | 起算日 | | | | | | | |
| 2週間目 | | | | | | | | ② |
| 3週間目 | | | | 2週目土曜日分の閉所 | | | | 1期間目 |
| 4週間目 | 3週目土曜日分の閉所 | | 3週目日曜日分の閉所 | | | | | |
| 5週間目 | | | | | | | | |
| 6週間目 | | | | | 5週目日曜日分の閉所 | | | ③ |
| 7週間目 | 6週目土曜日分の閉所 | | | | | | | 2期間目 |
| 8週間目 | | 7週目土曜日分の閉所 | 祝日 | 祝日分の閉所 | 7週目日曜日分の閉所 | | | 3期間目 |
| 12週間目 | | | | | | | | |
| 13週間目 | | ⑤評価対象外 | | | | | | |
| 14週間目 | | ⑤評価対象外 | | | | | | |
| 15週間目 | | ⑤評価対象外 | | 工事完了日 | | | | |

作業日
 閉所日
